


PLANO DE TRABALHOS
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

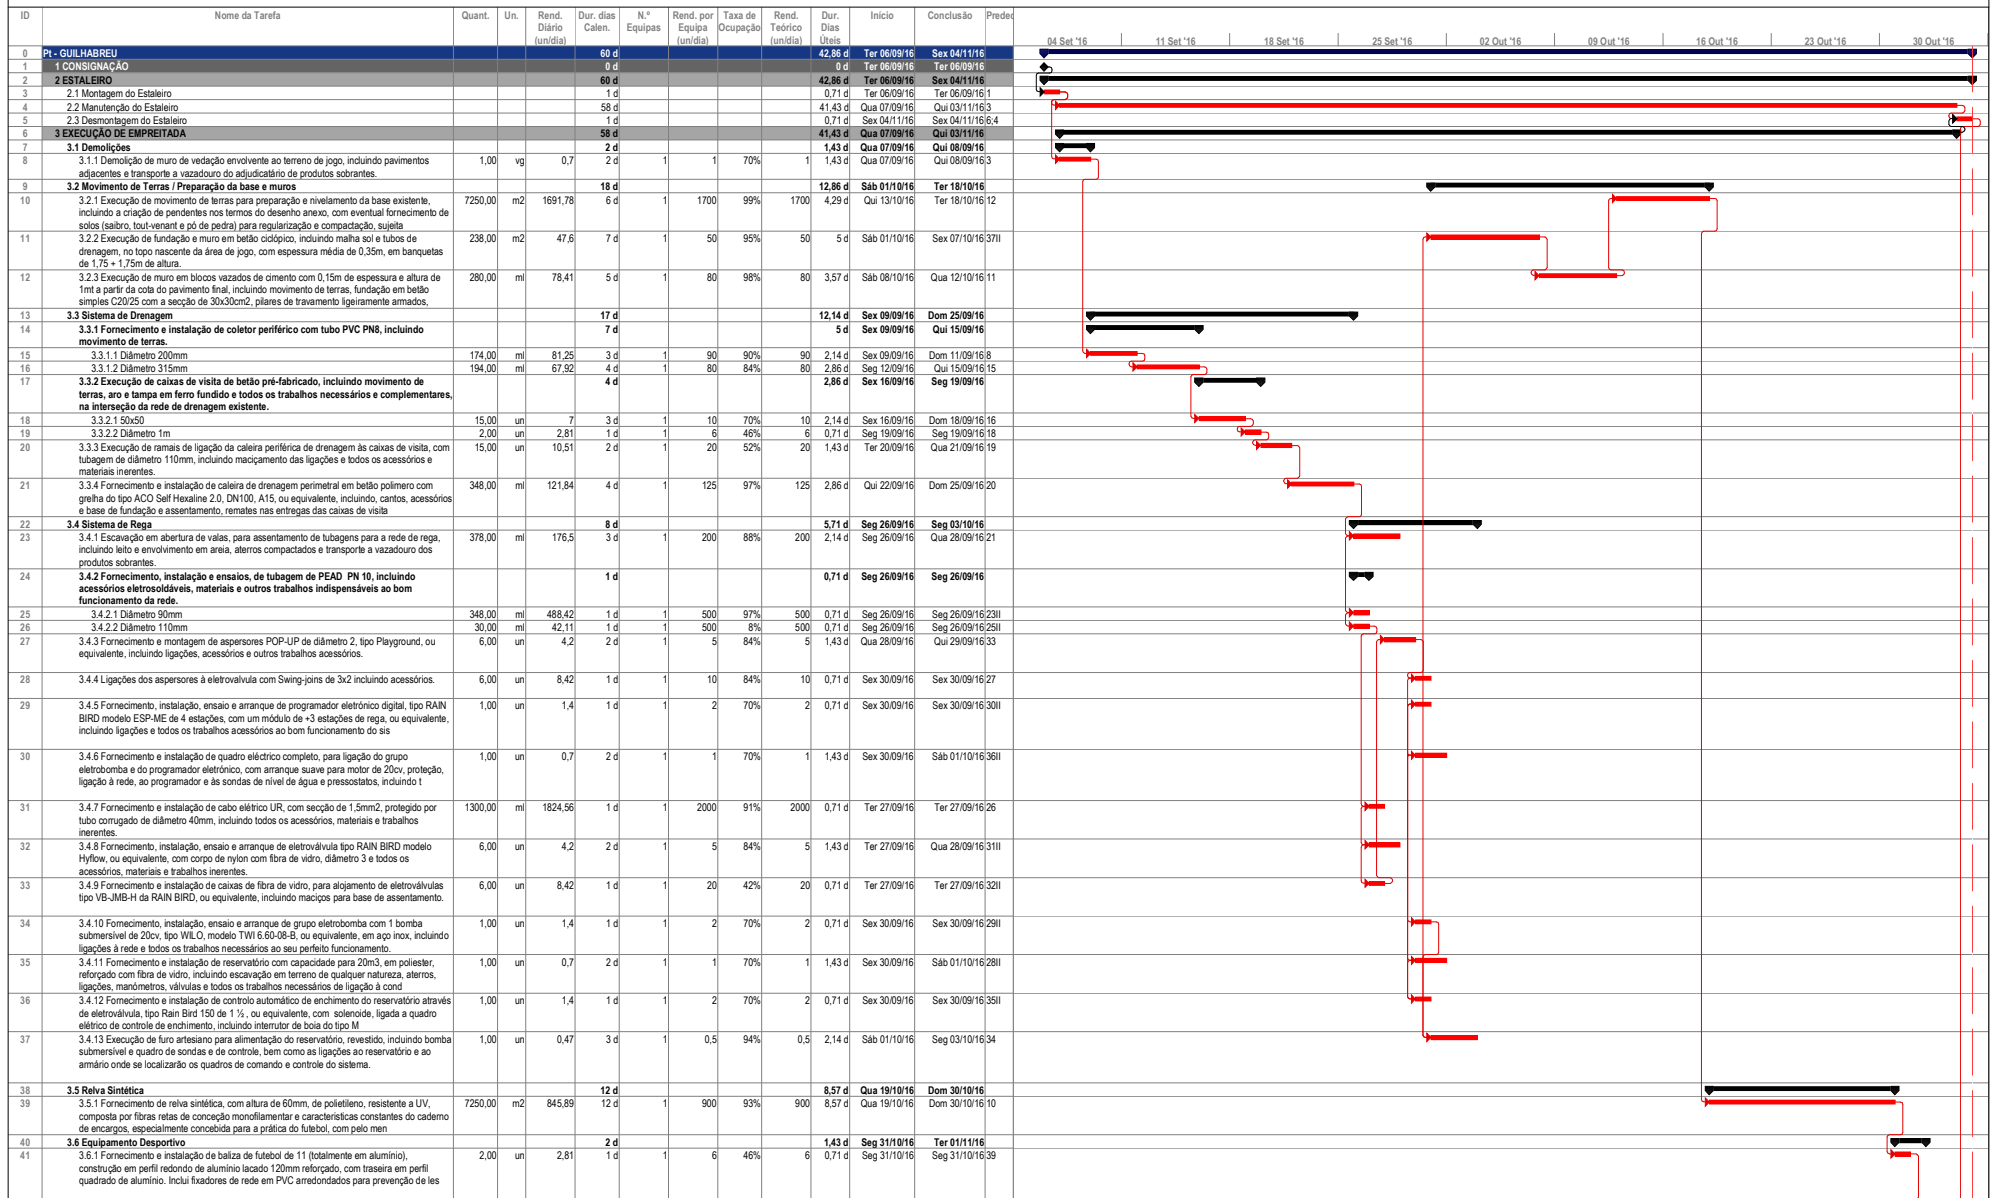

PLANO DE TRABALHOS
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

ID	Nome da Tarefa	Quant.	Un.	Rend. Diário (un/dia)	Dur. dias Calen.	N.º Equipas	Rend. por Equipa (un/dia)	Taxa de Ocupação	Rend. Teórico (un/dia)	Dur. Dias Úteis	Início	Conclusão	Predecessores	04 Set '16	11 Set '16	18 Set '16	25 Set '16	02 Out '16	09 Out '16	16 Out '16	23 Out '16	30 Out '16
42	3.6.2 Fornecimento e colocação de bandeirolas de canto incluindo negativos e todos os trabalhos necessários à sua perfeita aplicação.	4,00	un	5,61	1 d	1	12	46%	12	0,71 d	Ter 01/11/16	Ter 01/11/16	41									
43	3.7 Diversos				2 d					1,43 d	Qua 02/11/16	Qui 03/11/16										
44	3.7.1 Ensaios de campo e emissão de Certificação FIFA 2 Estrelas / Quality Pro.	1,00	vg	1,4	1 d	1	2	70%	2	0,71 d	Qua 02/11/16	Qua 02/11/16	42									
45	3.7.2 Letring em aço inox escovado com a inscrição Parque Municipal de Jogos - Guilhabreu	1,00	vg	1,4	1 d	1	2	70%	2	0,71 d	Qui 03/11/16	Qui 03/11/16	44									
46	4 RECEPÇÃO				0 d					0 d	Sex 04/11/16	Sex 04/11/16	5									

LEGENDA:

Tarefa Tarefa Crítica Marco Tarefa Sumário Resumo de Projecto Tarefa Manual Progresso Manual
