



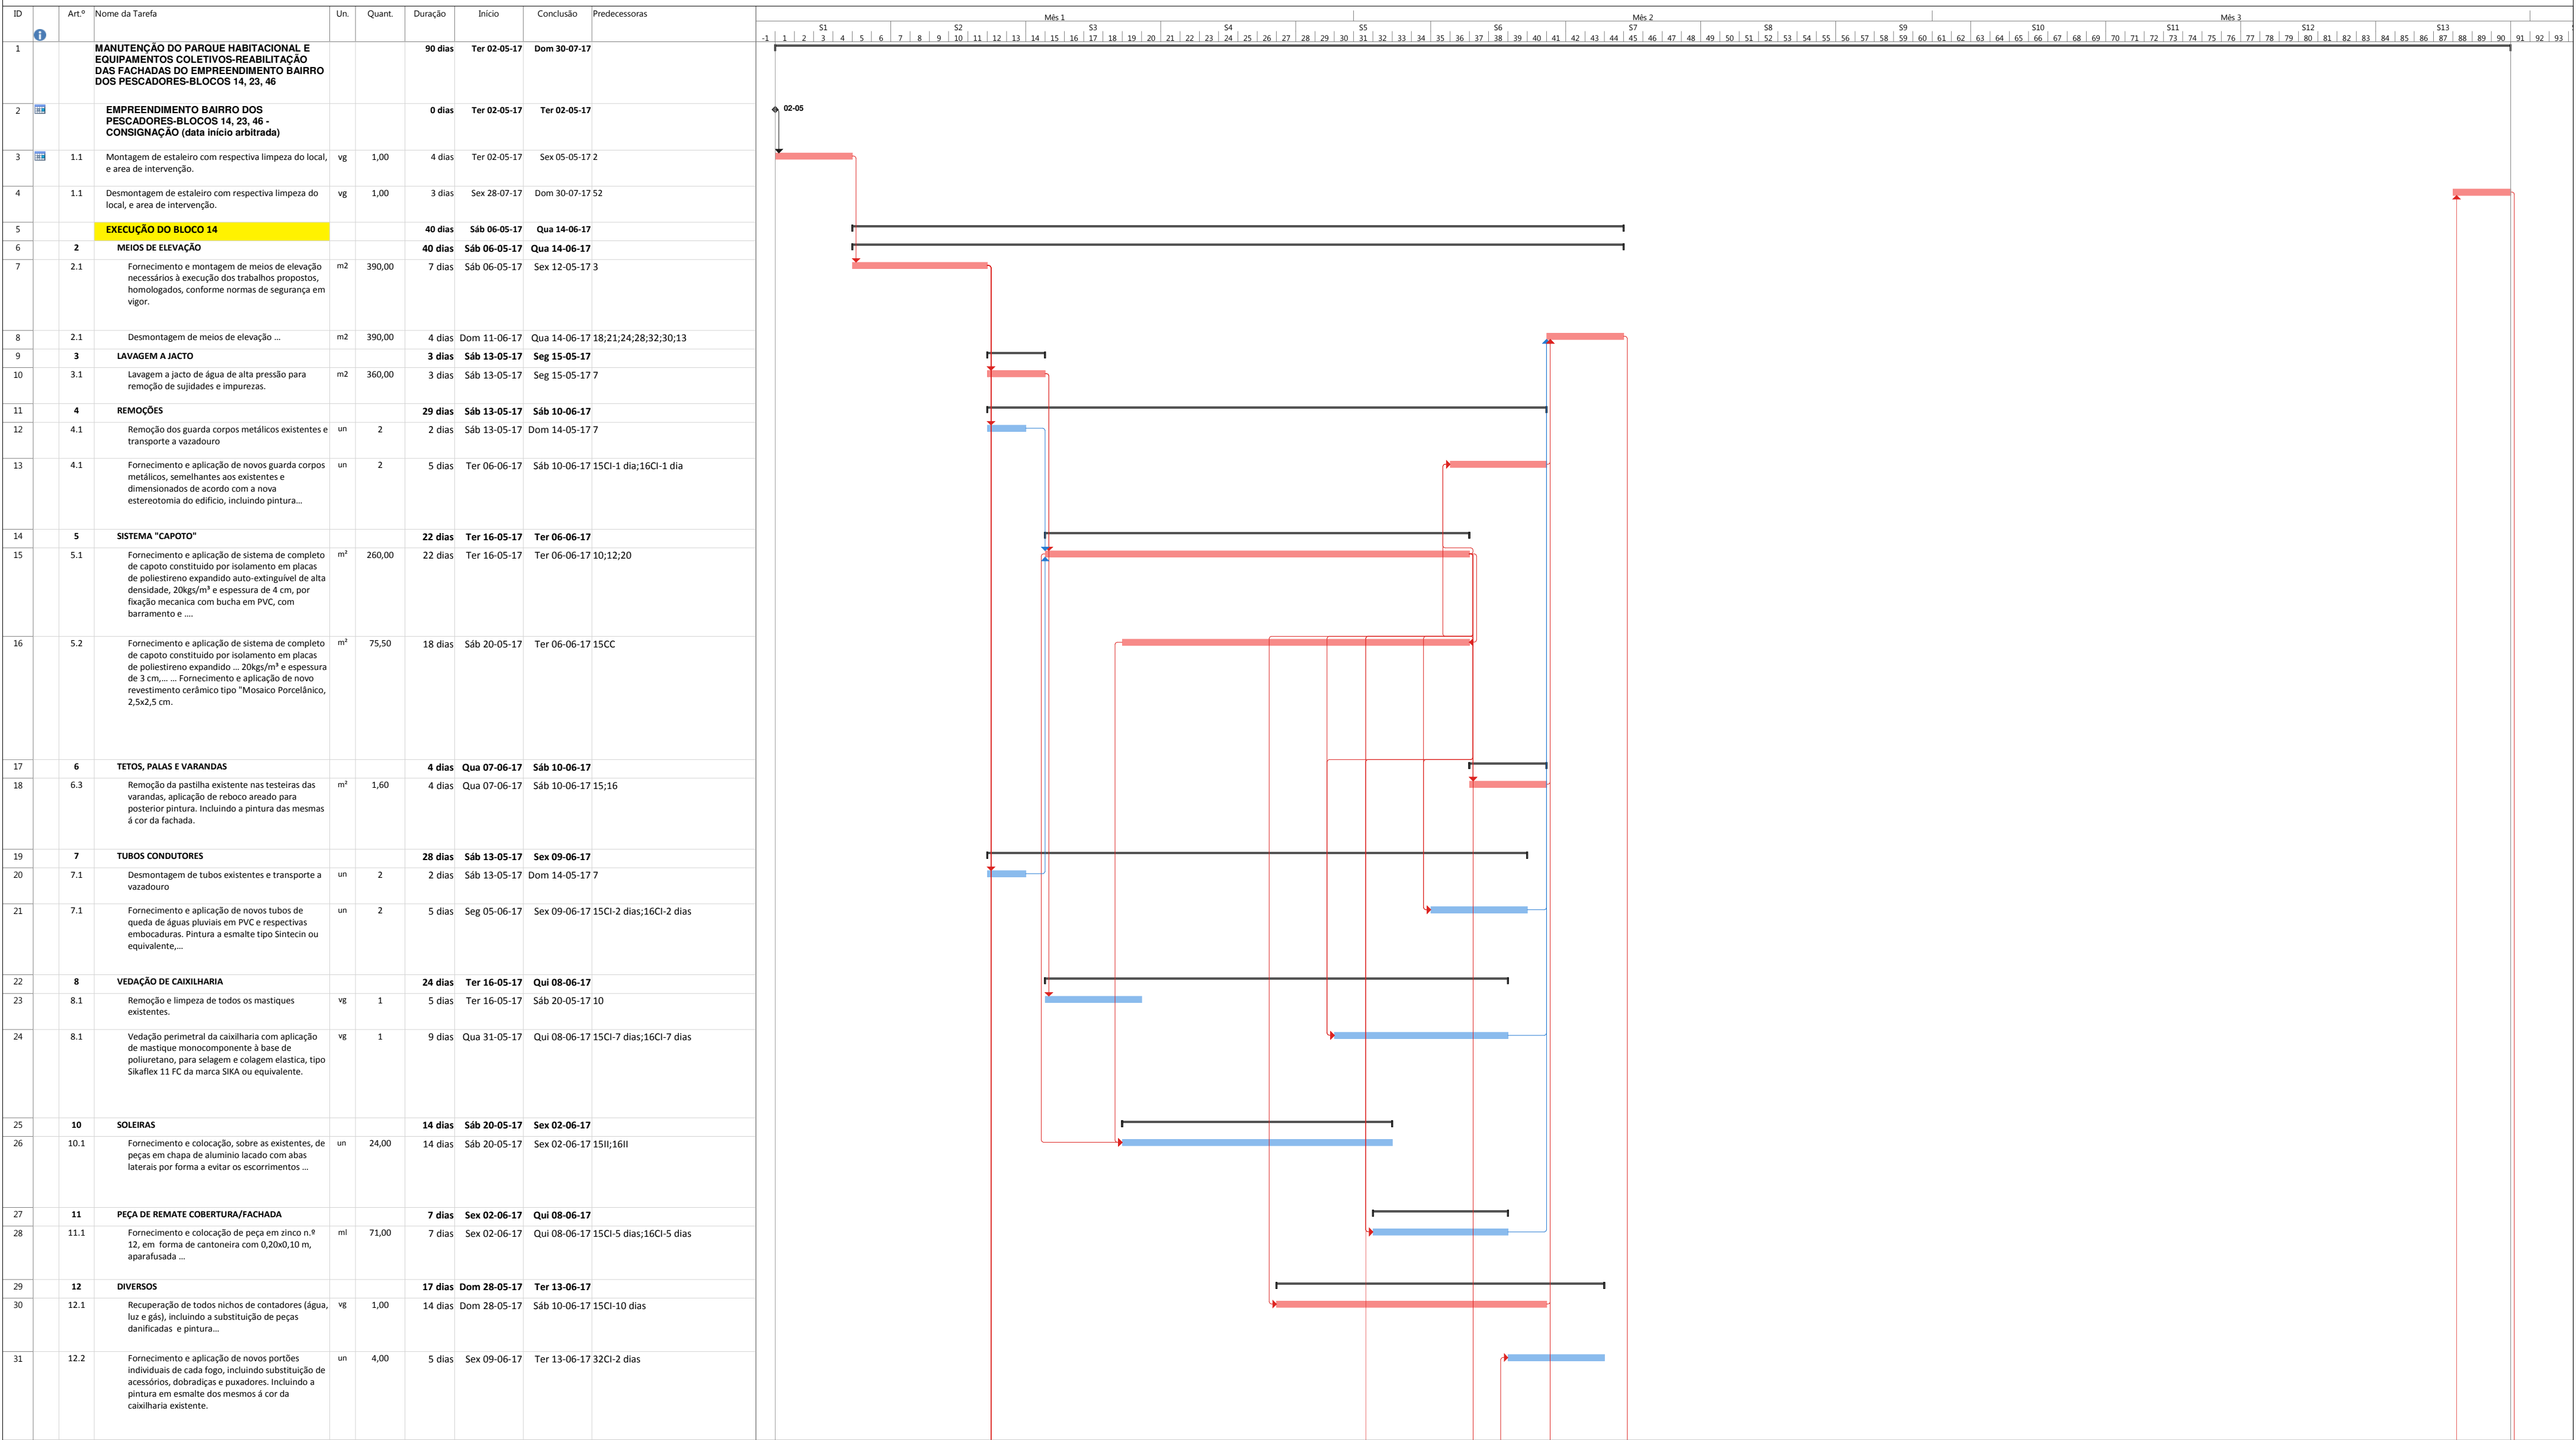

“MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS -



REABILITAÇÃO DAS FACHADAS DO EMPREENDIMENTO BAIRRO DOS PESCADORES – BLOCOS 14, 23, 46”

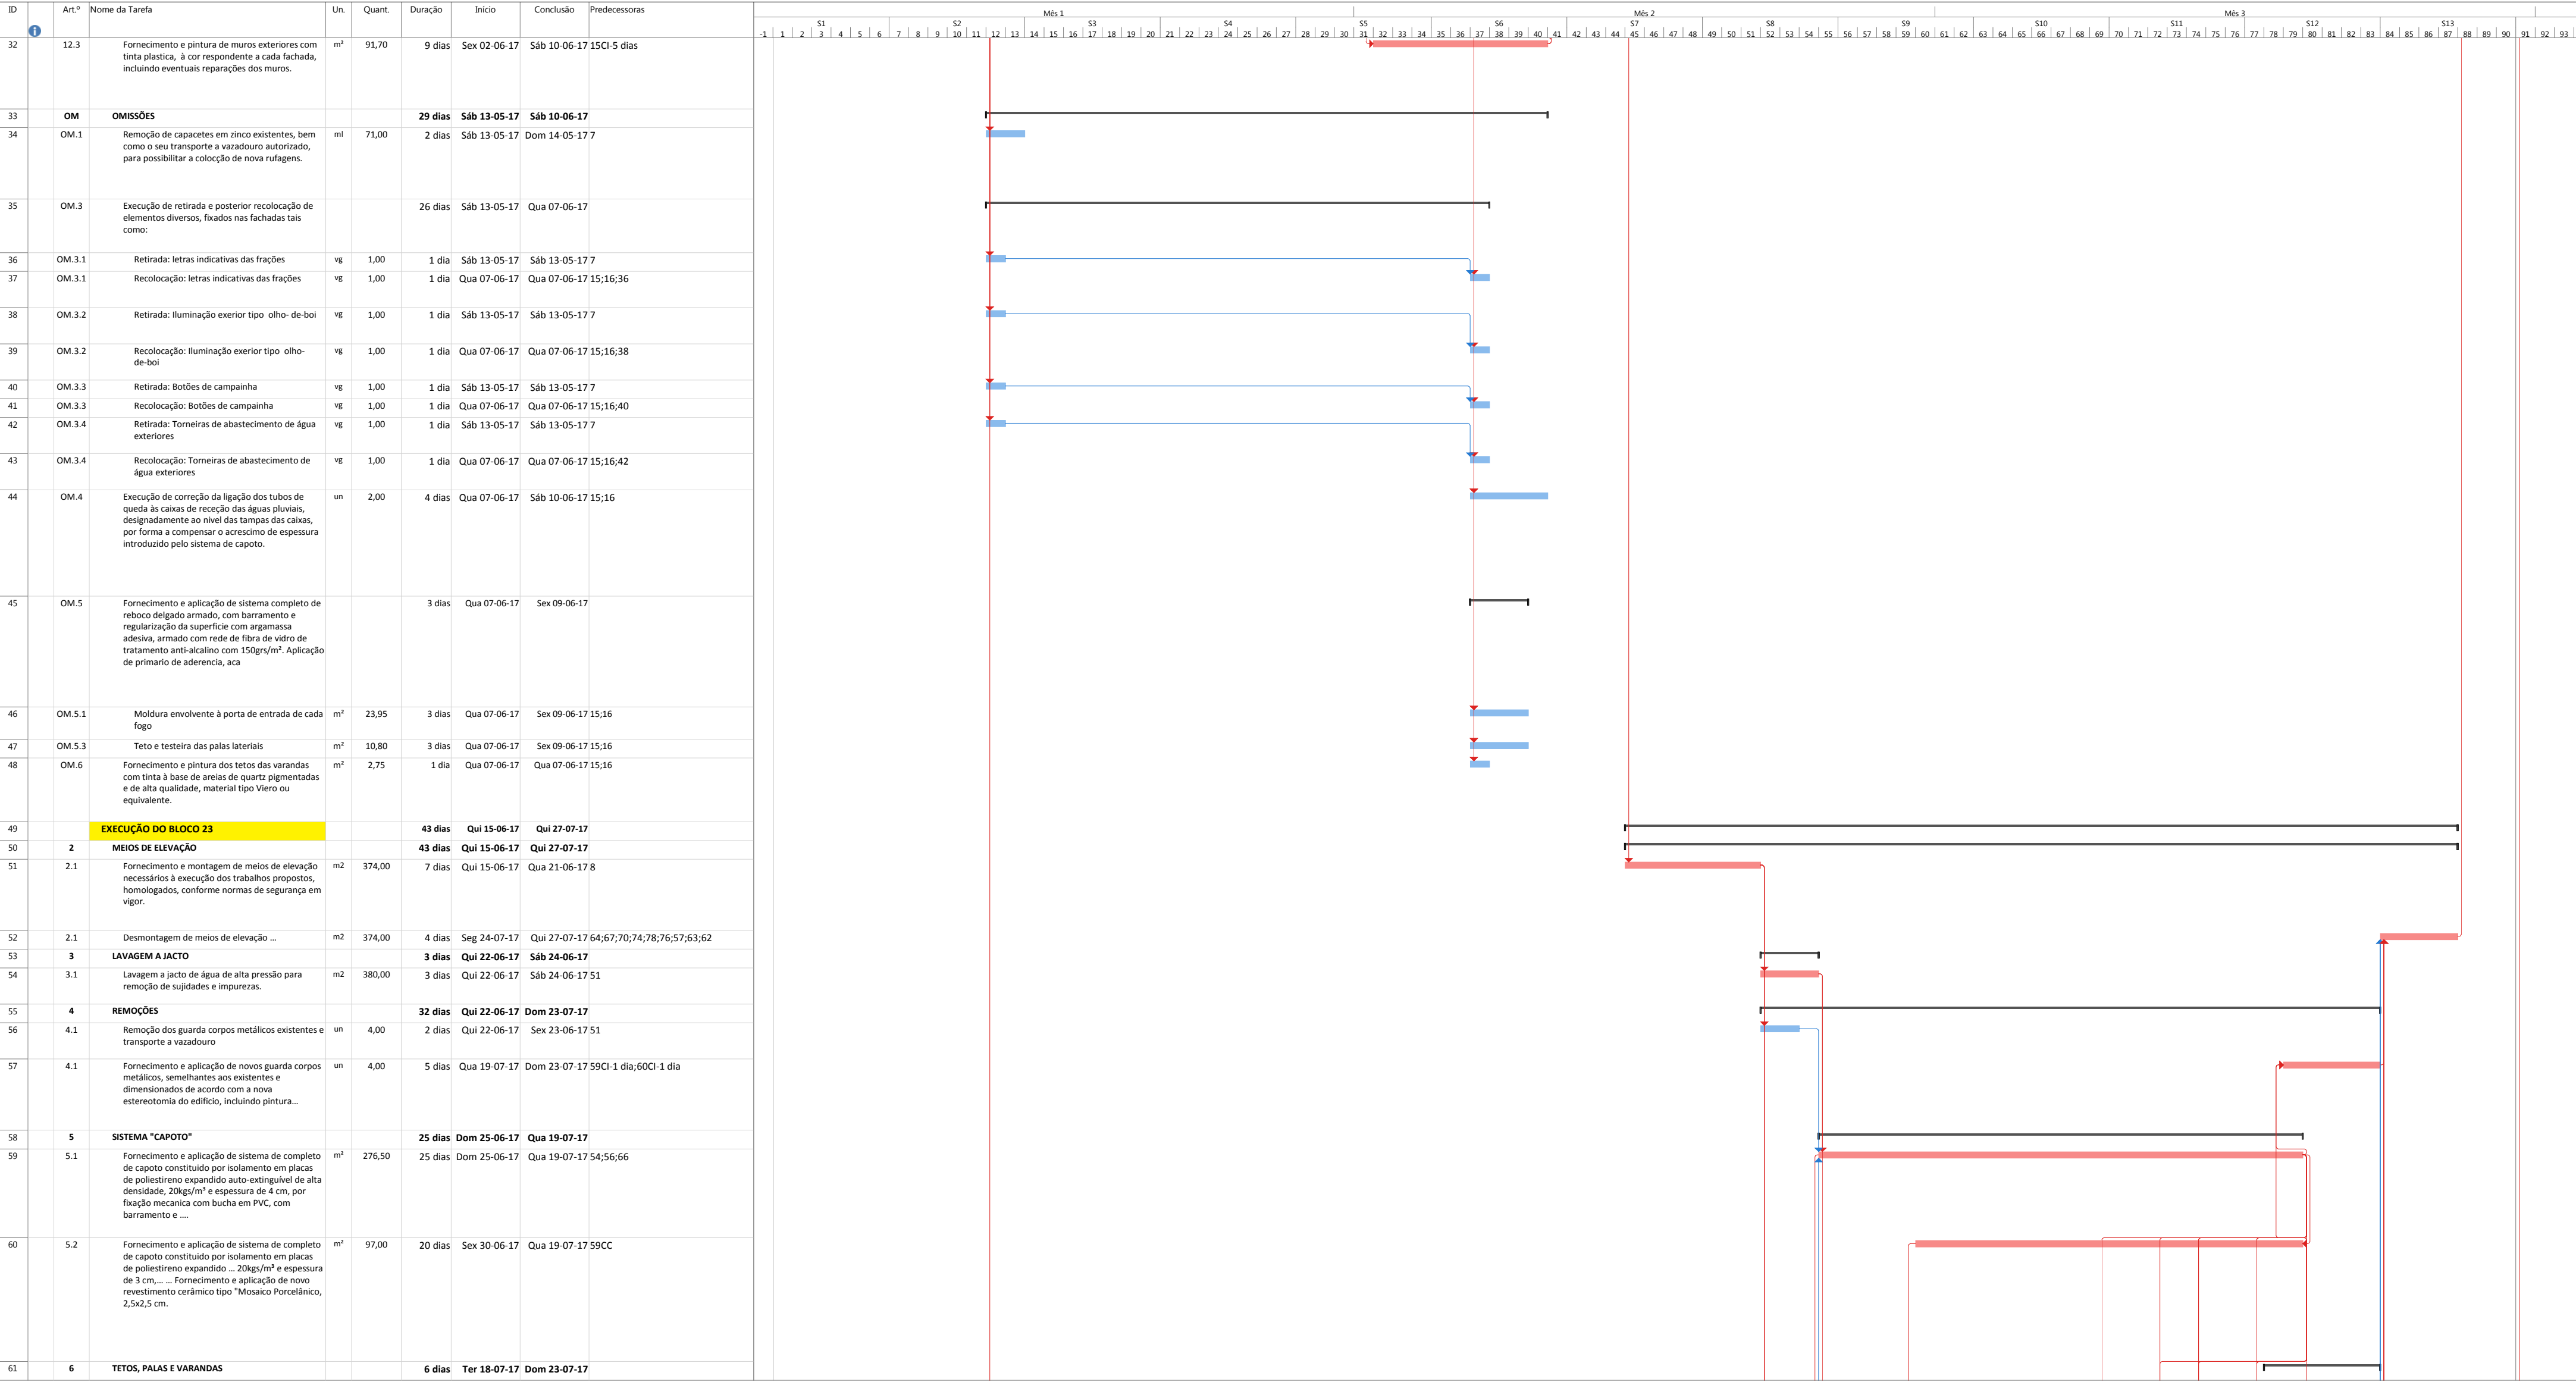

Nome da Tarefa		Un.	Quant.	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	Gantt Chart																																																																																													
ID	Art.º							Timeline (Days 1 to 93)																																																																																													
62	6.1	Remoção da impermeabilização existente das palas, incluindo o seu transporte a vazadouro. Fornecimento e aplicação de complexo impermeabilizante, constituído por primário de aderência e duas membranas de betume asfáltico elastomero...	m²	4,00	5 dias	Ter 18-07-17	Sáb 22-07-17	59CI-2 dias;60CI-2 dias																																																																																													
63	6.2	Fornecimento e pintura dos tetos das palas com tinta à base de areias de quartz pigmentadas e de alta qualidade, material tipo Viero ou equivalente.	m²	4,00	4 dias	Qui 20-07-17	Dom 23-07-17	59;60																																																																																													
64	6.3	Remoção da pastilha existente nas testeiiras das varandas, aplicação de reboco areado para posterior pintura. Incluindo a pintura das mesmas à cor da fachada.	m²	3,90	4 dias	Qui 20-07-17	Dom 23-07-17	59;60																																																																																													
65	7	TUBOS CONDUTORES			31 dias	Qui 22-06-17	Sáb 22-07-17																																																																																														
66	7.1	Desmontagem de tubos existentes e transporte a vazadouro	un	2	2 dias	Qui 22-06-17	Sex 23-06-17	51																																																																																													
67	7.1	Fornecimento e aplicação de novos tubos de queda de águas pluviais em PVC e respectivas embocaduras. Pintura a esmalte tipo Sintecin ou equivalente,...	un	2	5 dias	Ter 18-07-17	Sáb 22-07-17	59CI-2 dias;60CI-2 dias																																																																																													
68	8	VEDAÇÃO DE CAIXILHARIA			27 dias	Dom 25-06-17	Sex 21-07-17																																																																																														
69	8.1	Remoção e limpeza de todos os mastiques existentes.	vg	1	5 dias	Dom 25-06-17	Qui 29-06-17	54																																																																																													
70	8.1	Vedação perimetral da caixilharia com aplicação de mastique monocomponente à base de poliuretano, para selagem e colagem elastica, tipo Sikaflex 11 FC da marca SIKA ou equivalente.	vg	1	9 dias	Qui 13-07-17	Sex 21-07-17	59CI-7 dias;60CI-7 dias																																																																																													
71	10	SOLEIRAS			14 dias	Sex 30-06-17	Qui 13-07-17																																																																																														
72	10.1	Fornecimento e colocação, sobre as existentes, de peças em chapa de alumínio lacado com abas laterais por forma a evitar os escorrimentos ...	un	40,00	14 dias	Sex 30-06-17	Qui 13-07-17	59II;60II																																																																																													
73	11	PEÇA DE REMATE COBERTURA/FACHADA			7 dias	Sáb 15-07-17	Sex 21-07-17																																																																																														
74	11.1	Fornecimento e colocação de peça em zinco n.º 12, em forma de cantoneira com 0,20x0,10 m, aparafusada ...	ml	63,00	7 dias	Sáb 15-07-17	Sex 21-07-17	59CI-5 dias;60CI-5 dias																																																																																													
75	12	DIVERSOS			17 dias	Seg 10-07-17	Qua 26-07-17																																																																																														
76	12.1	Recuperação de todos nichos de contadores (água, luz e gás), incluindo a substituição de peças danificadas e pintura...	vg	1,00	14 dias	Seg 10-07-17	Dom 23-07-17	59CI-10 dias																																																																																													
77	12.2	Fornecimento e aplicação de novos portões individuais de cada fogo, incluindo substituição de acessórios, dobradiças e puxadores. Incluindo a pintura em esmalte dos mesmos à cor da caixilharia existente.	un	4,00	5 dias	Sáb 22-07-17	Qua 26-07-17	78CI-2 dias																																																																																													
78	12.3	Fornecimento e pintura de muros exteriores com tinta plastica, à cor respondente a cada fachada, incluindo eventuais reparações dos muros.	m²	133,80	9 dias	Sáb 15-07-17	Dom 23-07-17	59CI-5 dias																																																																																													
79	OM	OMISSÕES			32 dias	Qui 22-06-17	Dom 23-07-17																																																																																														
80	OM.3	Execução de retirada e posterior recolocação de elementos diversos, fixados nas fachadas tais como:			29 dias	Qui 22-06-17	Qui 20-07-17																																																																																														
81	OM.3.1	Retirada: letras indicativas das frações	vg	1,00	1 dia	Qui 22-06-17	Qui 22-06-17	51																																																																																													
82	OM.3.1	Recolocação: letras indicativas das frações	vg	1,00	1 dia	Qui 20-07-17	Qui 20-07-17	59;60;81																																																																																													
83	OM.3.2	Retirada: iluminação exterior tipo olho-de-boi	vg	1,00	1 dia	Qui 22-06-17	Qui 22-06-17	51																																																																																													
84	OM.3.2	Recolocação: iluminação exterior tipo olho-de-boi	vg	1,00	1 dia	Qui 20-07-17	Qui 20-07-17	59;60;83																																																																																													
85	OM.3.3	Retirada: Botões de campainha	vg	1,00	1 dia	Qui 22-06-17	Qui 22-06-17	51																																																																																													
86	OM.3.3	Recolocação: Botões de campainha	vg	1,00	1 dia	Qui 20-07-17	Qui 20-07-17	59;60;85																																																																																													
87	OM.3.4	Retirada: Torneiras de abastecimento de água exteriores	vg	1,00	1 dia	Qui 22-06-17	Qui 22-06-17	51																																																																																													
88	OM.3.4	Recolocação: Torneiras de abastecimento de água exteriores	vg	1,00	1 dia	Qui 20-07-17	Qui 20-07-17	59;60;87																																																																																													
89	OM.4	Execução de correção da ligação dos tubos de queda às caixas de receção das águas pluviais, designadamente ao nível das tampas das caixas, por forma a compensar o acrescimento de espessura introduzido pelo sistema de capoto.	un	2,00	4 dias	Qui 20-07-17	Dom 23-07-17	59;60																																																																																													


“MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS -

REABILITAÇÃO DAS FACHADAS DO EMPREENDIMENTO BAIRRO DOS PESCADORES – BLOCOS 14, 23, 46”

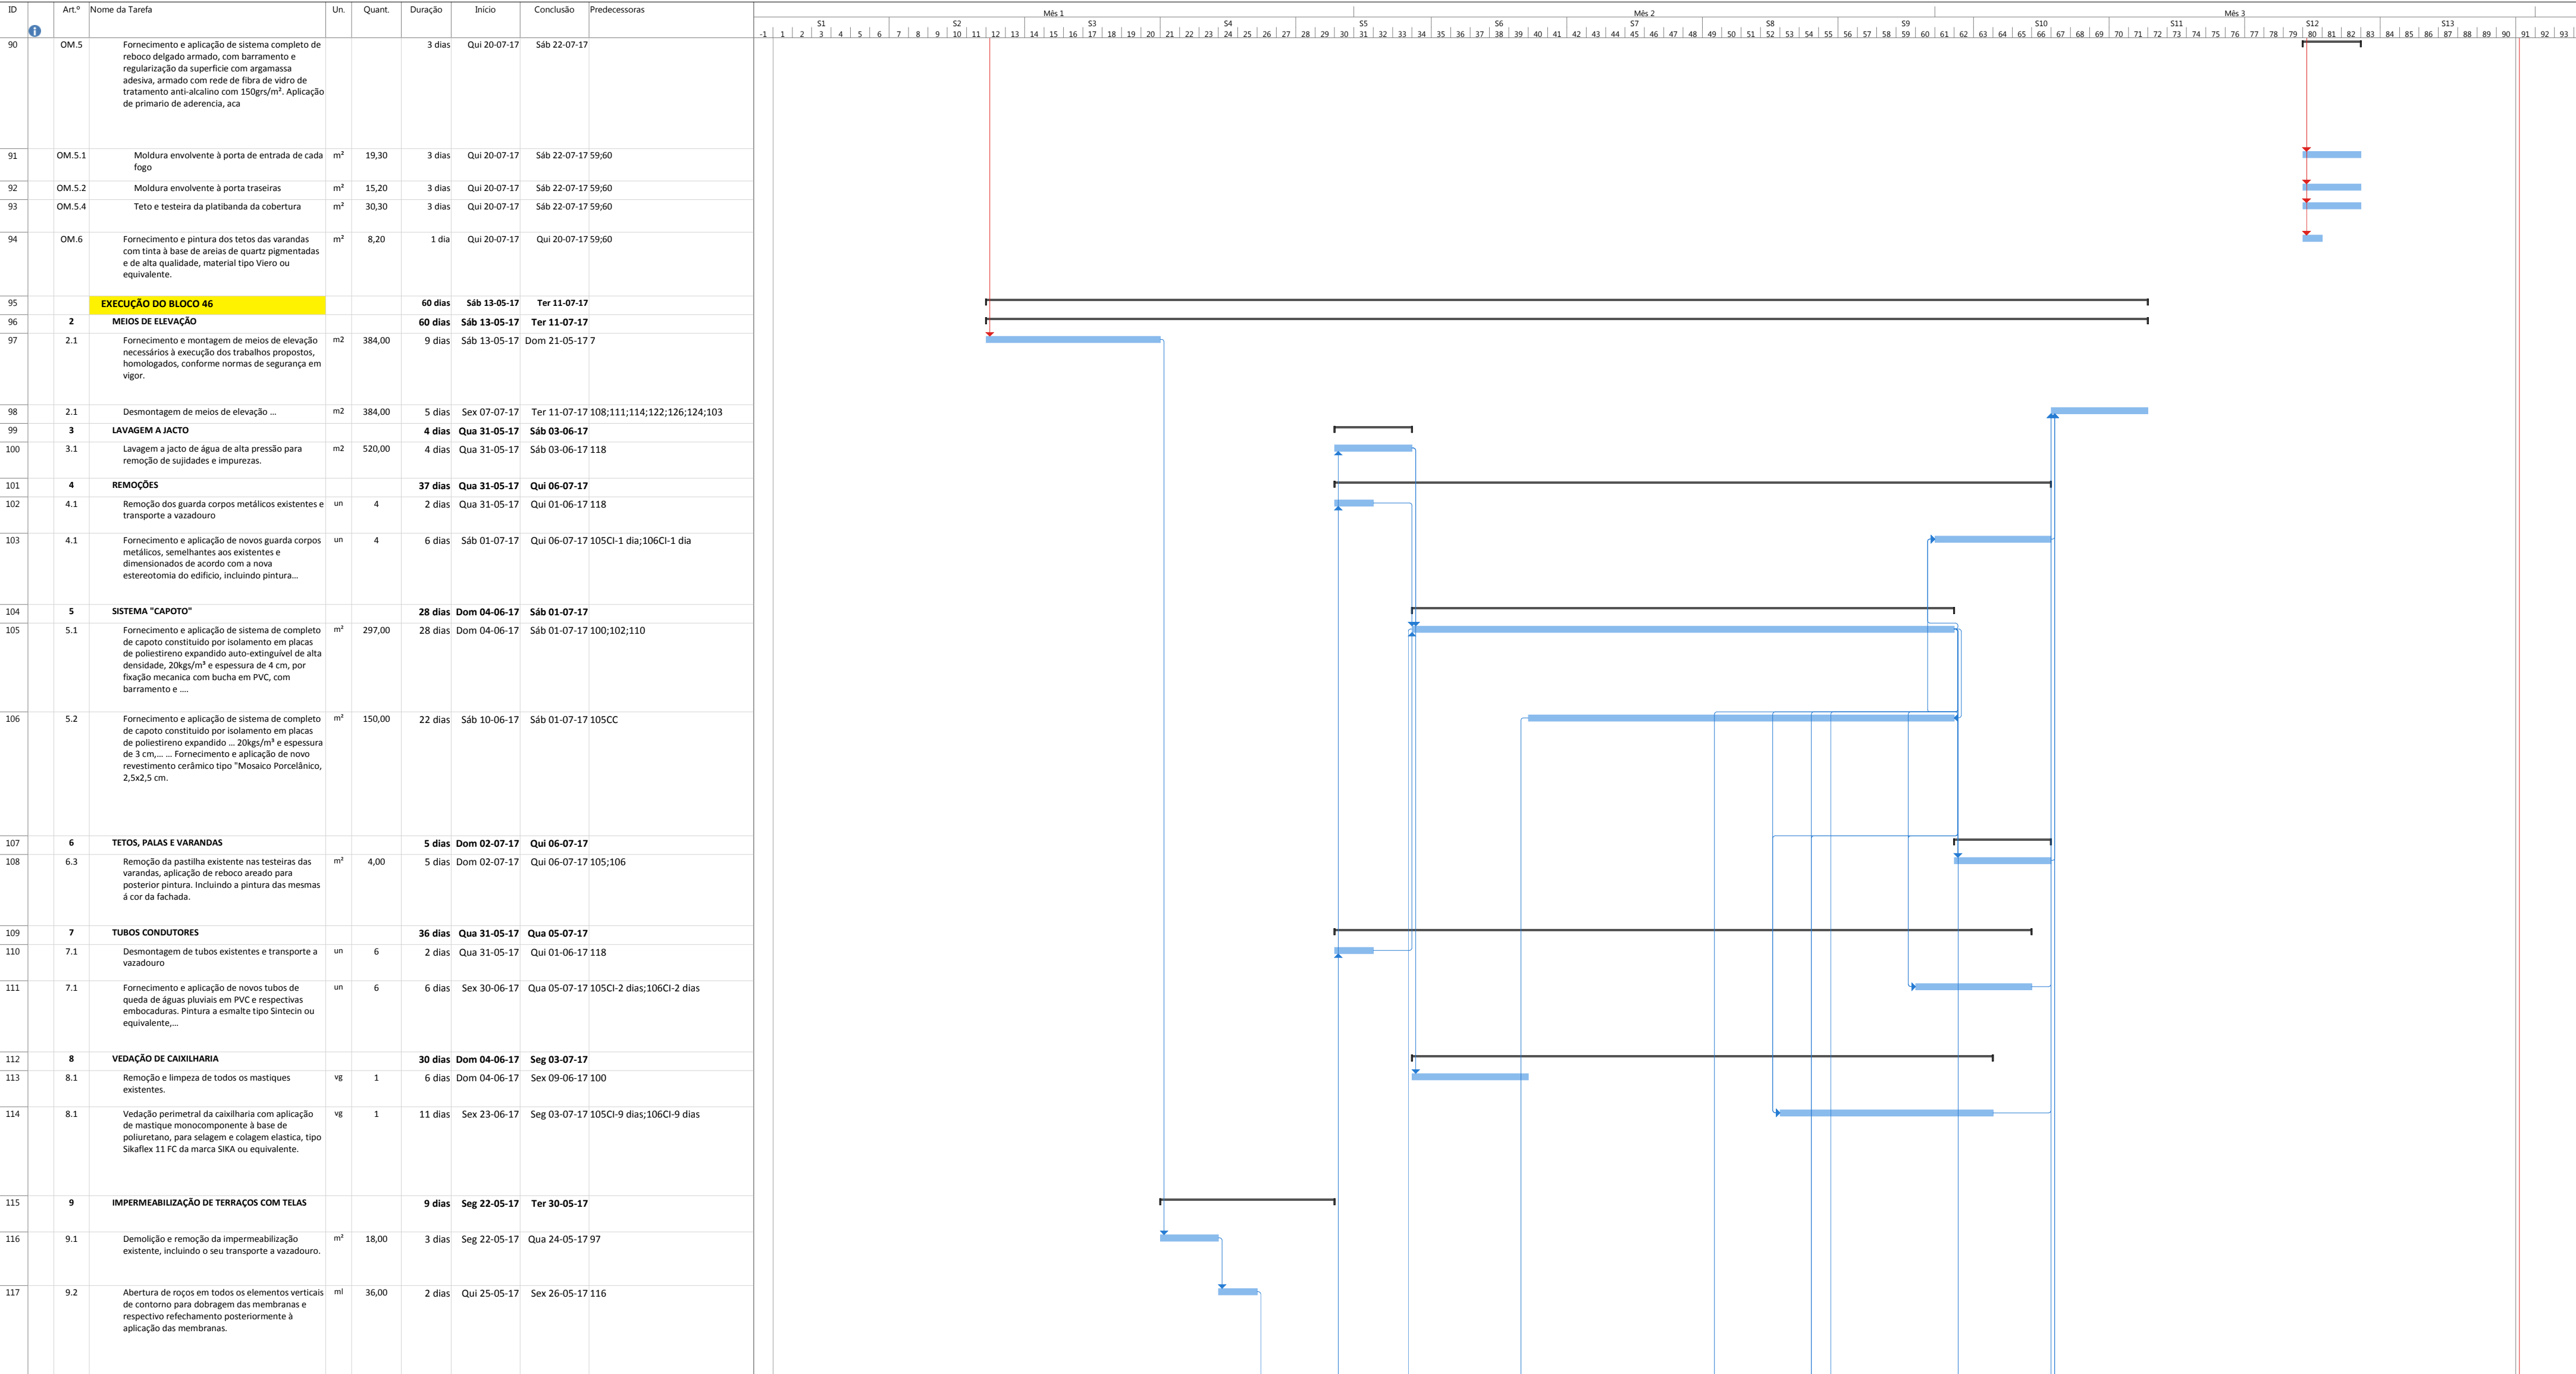

“MANUTENÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL E EQUIPAMENTOS COLETIVOS -

REABILITAÇÃO DAS FACHADAS DO EMPREENDIMENTO BAIRRO DOS PESCADORES – BLOCOS 14, 23, 46”

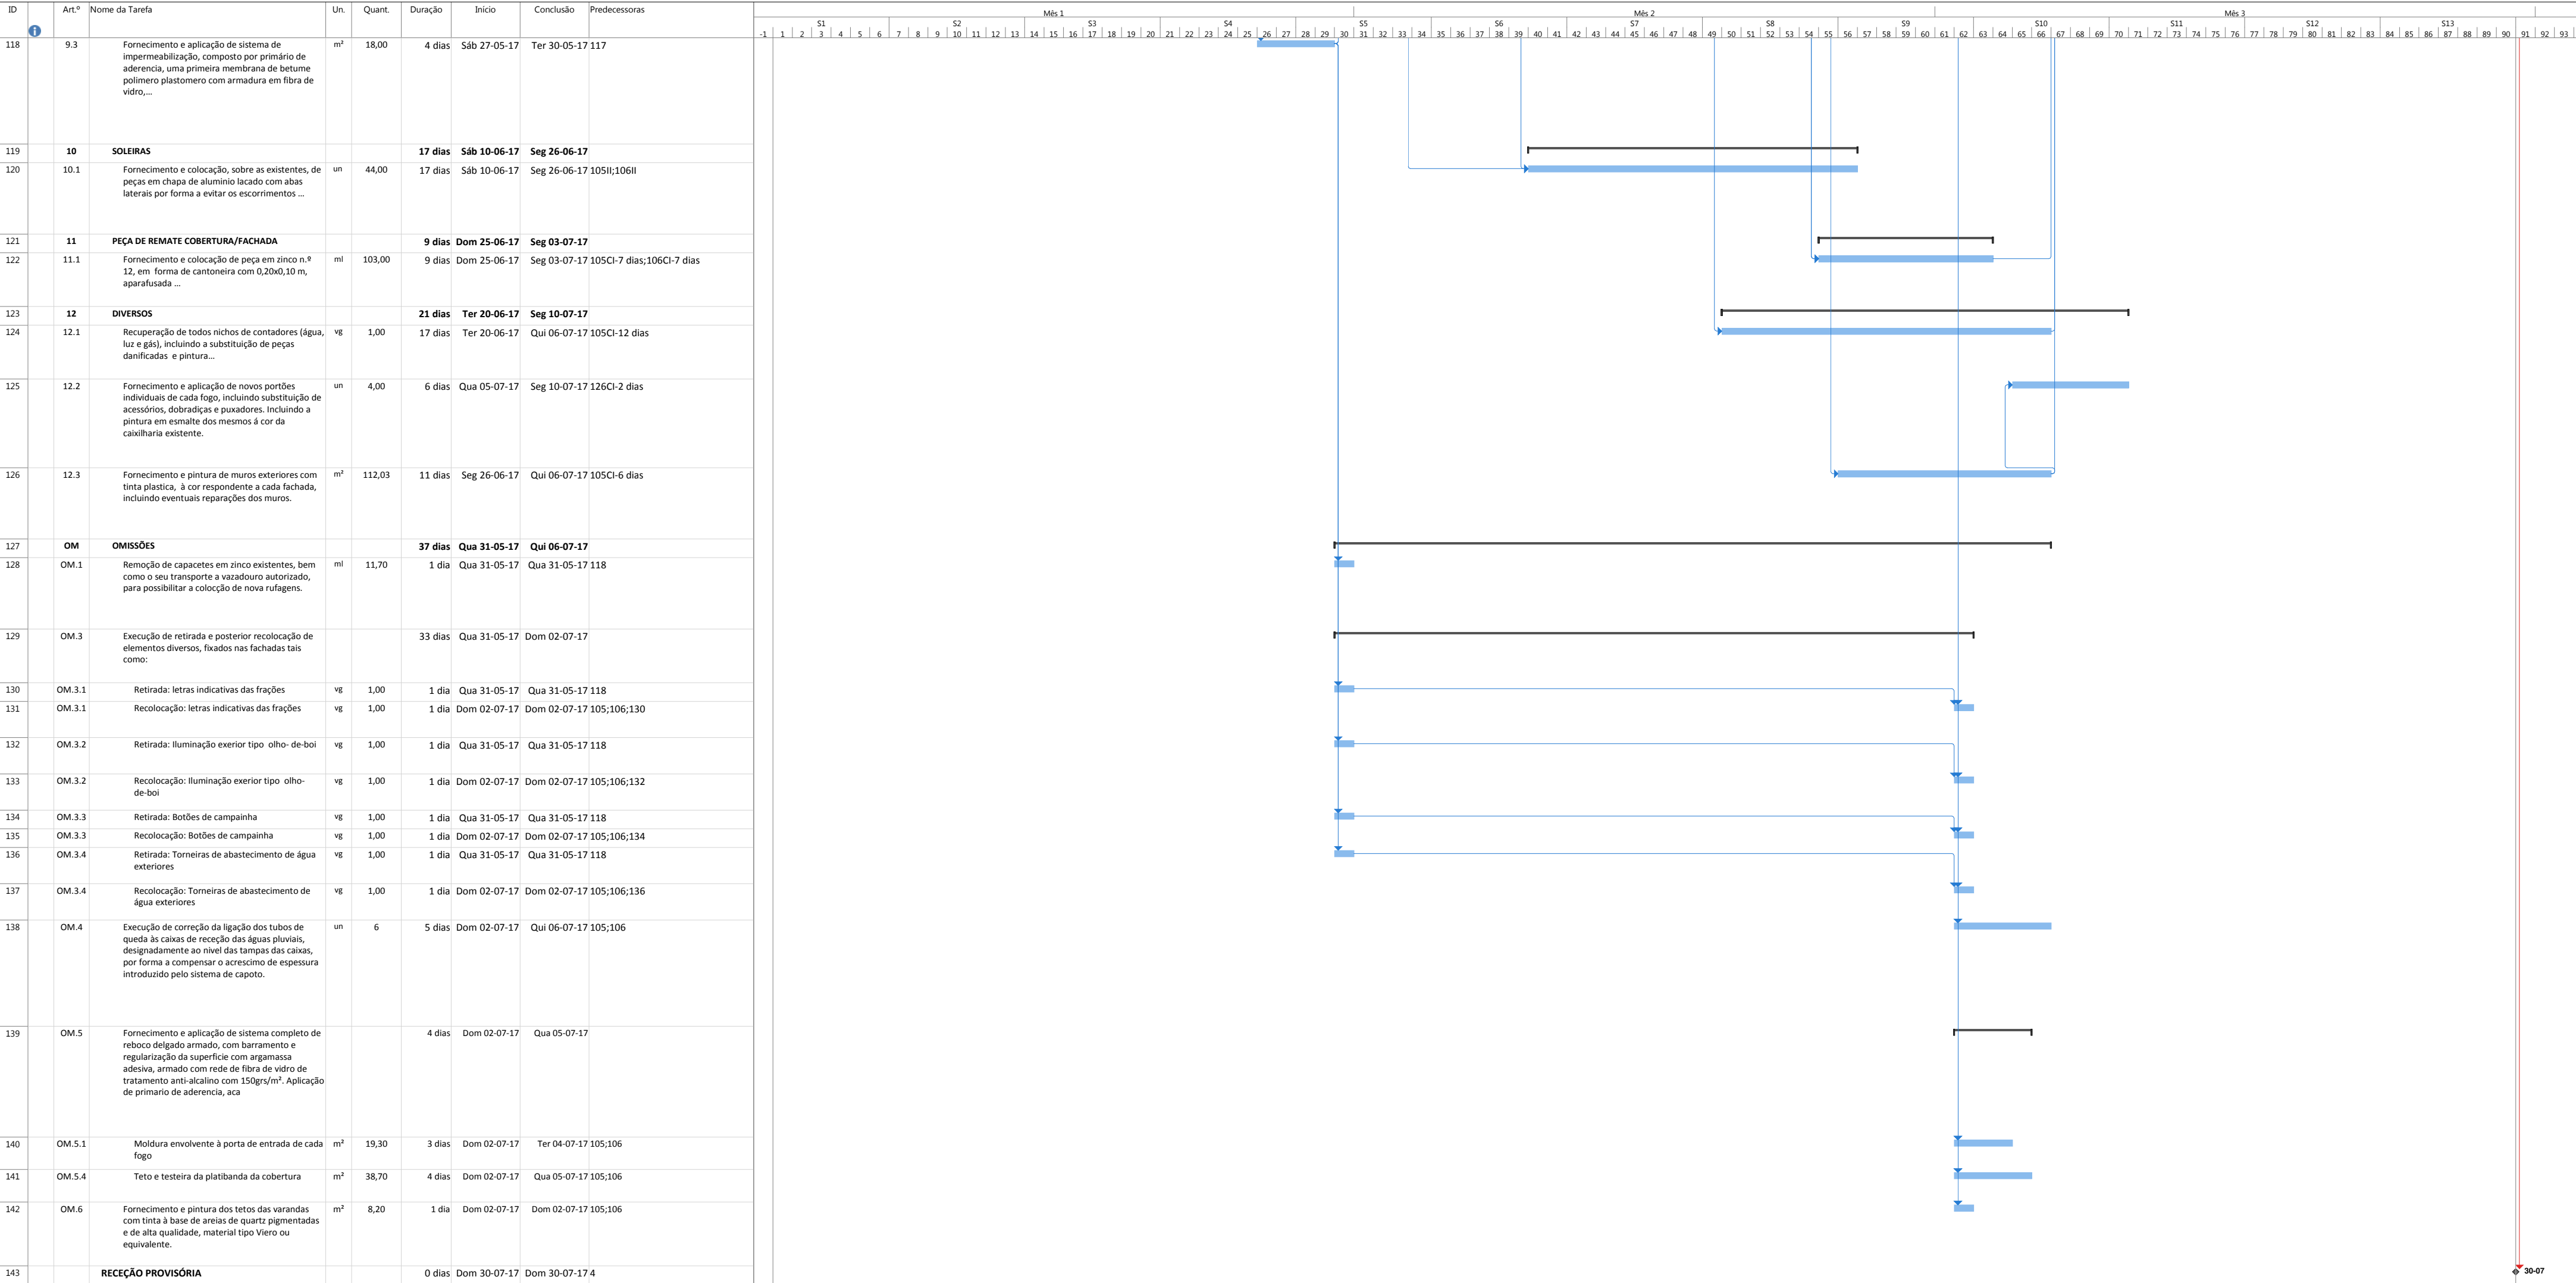

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

Tarefa

Dividir

Marco

Sumário

Resumo de Projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Apenas duração

Resumo da Agregação Manual

Resumo Manual

Apenas início

Apenas conclusão

Tarefas Externas

Marco Externo

Prazo

Critica

Critica Divisão

Progresso

Progresso Manual
