


PLANO DE TRABALHOS
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

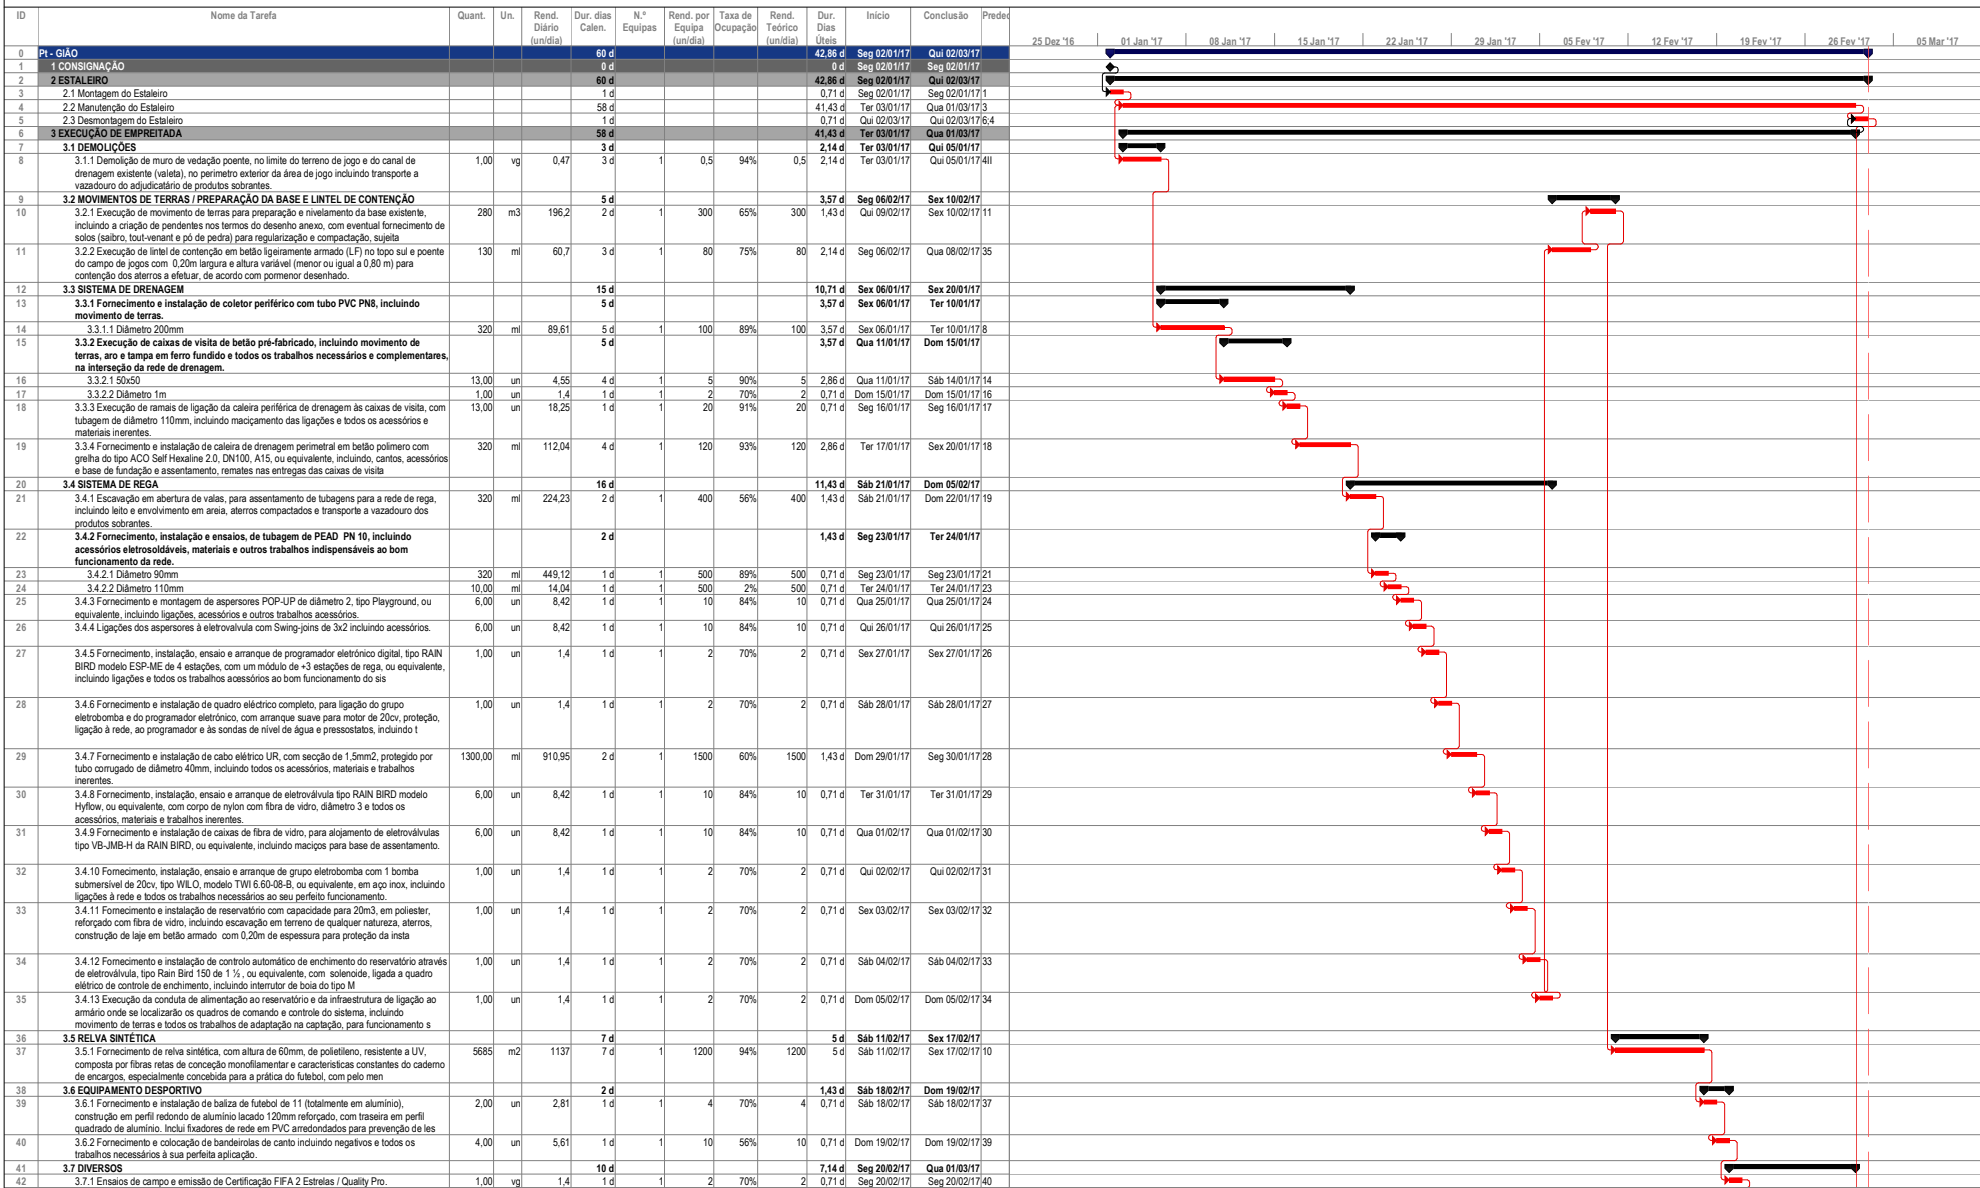

PLANO DE TRABALHOS
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

ID	Nome da Tarefa	Quant.	Un.	Rend. Diário (un/dia)	Dur. dias Calen.	N.º Equipas	Rend. por Equipa (un/dia)	Taxa de Ocupação	Rend. Teórico (un/dia)	Dur. Dias Úteis	Início	Conclusão	Prede	25 Dez '16	01 Jan '17	08 Jan '17	15 Jan '17	22 Jan '17	29 Jan '17	05 Fev '17	12 Fev '17	19 Fev '17	26 Fev '17	05 Mar '17
43	3.7.2 Letring em aço inox escovado com a inscrição Parque de Jogos Municipal - Gião, com 270mm altura e 3mm espessura.	1,00	vg	1,4	1 d	1	2	70%	2	0,71 d	Ter 21/02/17	Ter 21/02/17	42											
44	3.7.3 Fornecimento e colocação de guarda metálica em ferro galvanizado de 2 com apoios espaçados a 3m, incluindo primário e pintura à cor a escolher pela fiscalização, com pelo menos duas demãos, incluindo todos os trabalhos considerados como preparatórios e ac	100,00	ml	140,35	1 d	1	150	93%	150	0,71 d	Qua 22/02/17	Qua 22/02/17	43											
45	3.7.4 Fornecimento e colocação de portão metálico, chapado nas duas faces, galvanizado e pintado com dimensões iguais ao existente, incluindo a remoção do existente a vazadouro do adjudicatário.	1	un	1,4	1 d	1	2	70%	2	0,71 d	Qui 23/02/17	Qui 23/02/17	44											
46	3.7.5 Abertura de caixa em terreno de qualquer natureza na espessura de 0,20m, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa, o fornecimento e aplicação de betão com 0,10 m e o fornecimento e assentamento de pedra do chão retangular à cor natural com	385	m2	269,78	2 d	1	400	67%	400	1,43 d	Sex 24/02/17	Sáb 25/02/17	45											
47	3.7.6 Levantamento de pavimento existente, incluindo a sua remoção e transporte a vazadouro a cargo do adjudicatário, remoção da tela asfáltica existente, correção de pendentes com argamassa, fornecimento e aplicação de dupla tela cruzada asfáltica do tipo Ecop	164,15	m2	57,47	4 d	1	75	76%	75	2,86 d	Dom 26/02/17	Qua 01/03/17	46											
48	4 RECEPÇÃO				0 d					0 d	Qui 02/03/17	Qui 02/03/17	5											

LEGENDA:

Tarefa Tarefa Crítica Marco Tarefa Sumário Resumo de Projecto Tarefa Manual Progresso Manual
