


Câmara Municipal de Vila do Conde
Parque de Jogos Municipal – Rio Mau – Instalação de Relvado Sintético

Global Stadium , Lda

PLANO DE TRABALHOS
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

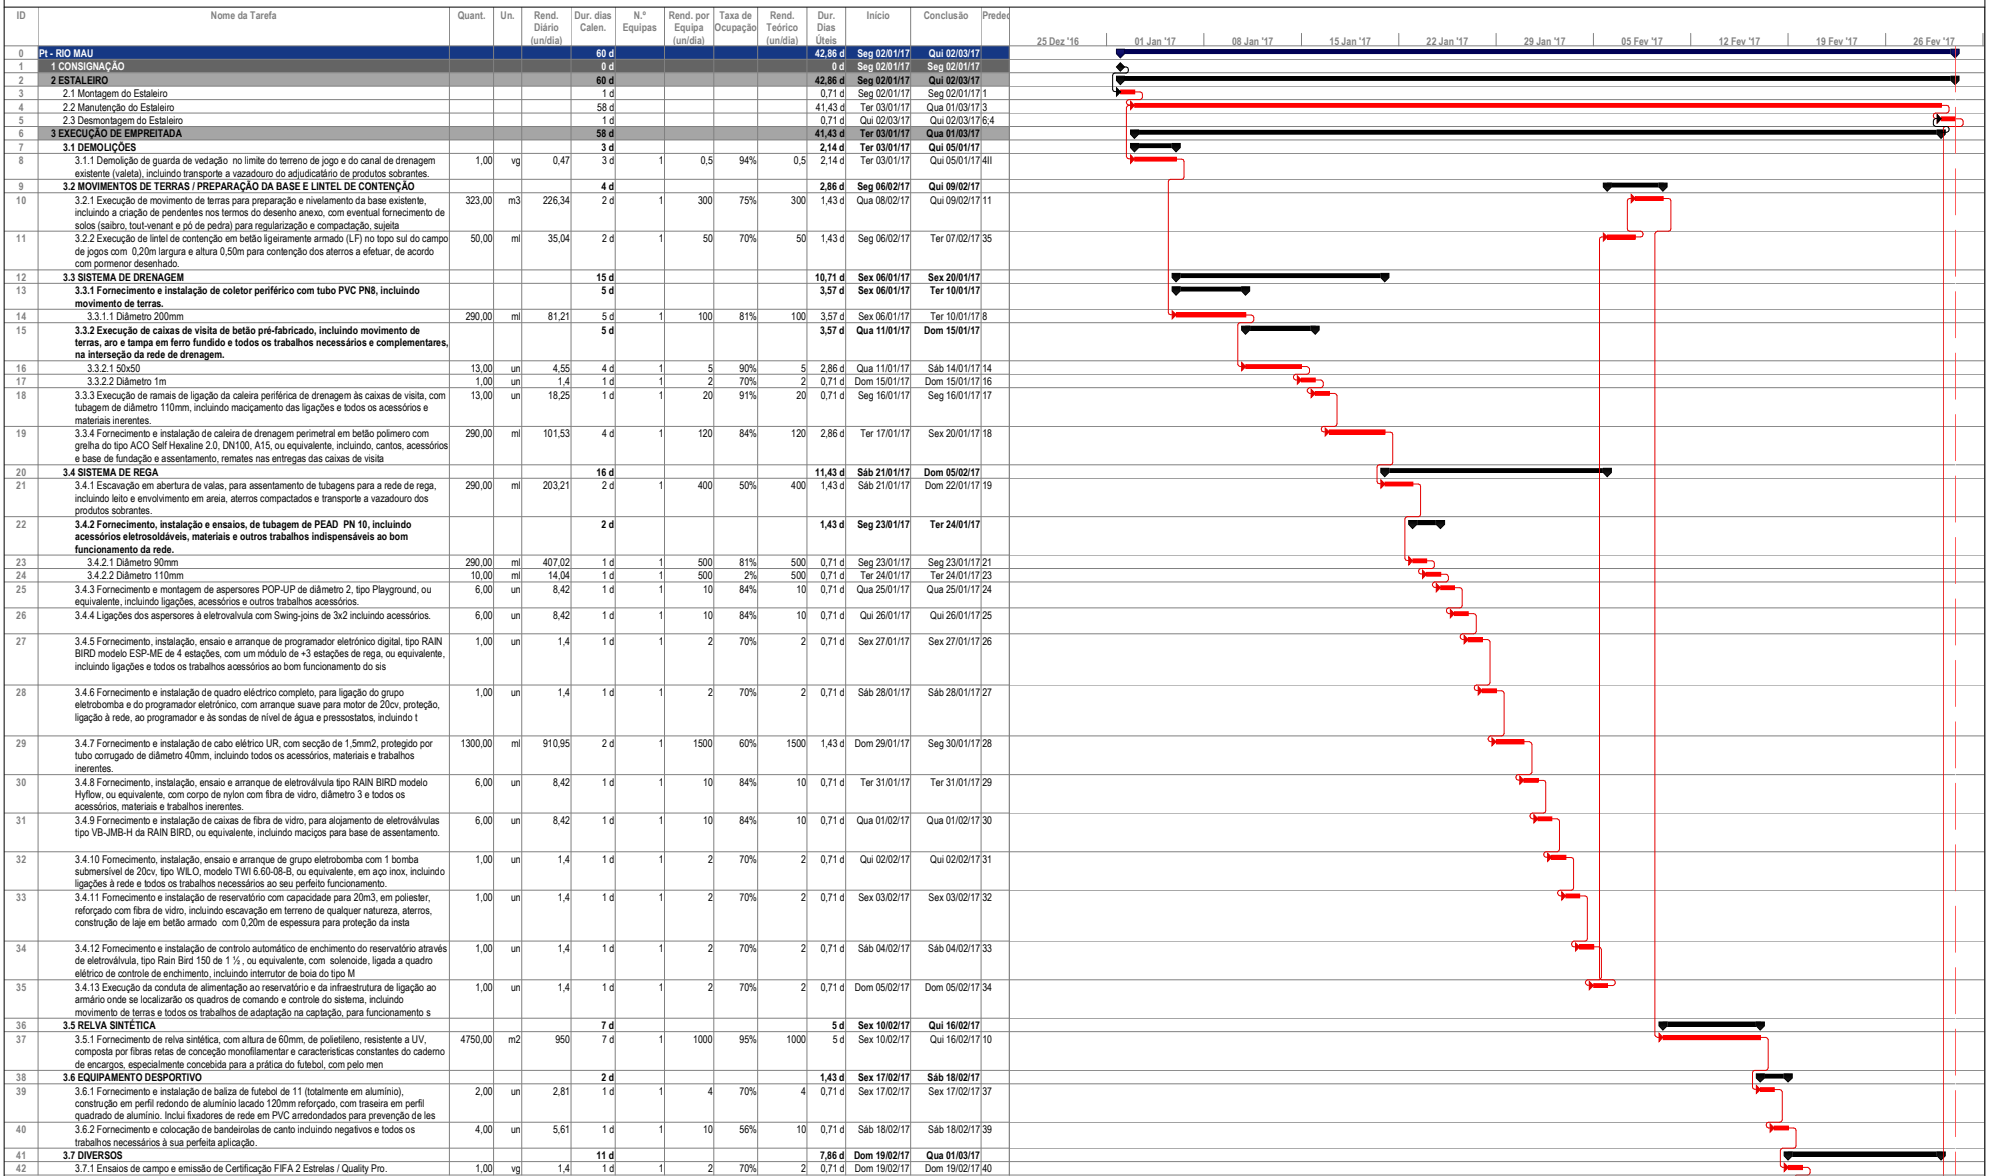

PLANO DE TRABALHOS
(PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 DIAS)

ID	Nome da Tarefa	Quant.	Un.	Rend. Diário (un/dia)	Dur. dias Calen.	N.º Equipas	Rend. por Equipa (un/dia)	Taxa de Ocupação	Rend. Teórico (un/dia)	Dur. Dias Úteis	Início	Conclusão	Prede	25 Dez '16	01 Jan '17	08 Jan '17	15 Jan '17	22 Jan '17	29 Jan '17	05 Fev '17	12 Fev '17	19 Fev '17	26 Fev '17
43	3.7.2 Letring em aço inox escovado com a inscrição Parque de Jogos Municipal - Rio Mau, com 270mm altura e 3mm espessura.	1,00	vg	1,4	1 d	1	2	70%	2	0,71 d	Seg 20/02/17	Seg 20/02/17	42										
44	3.7.3 Fornecimento e colocação de guarda metálica em ferro galvanizado de 2 com apoios espaçados a 3m, incluindo primário e pintura à cor a escolher pela fiscalização, com pelo menos duas demãos, incluindo todos os trabalhos considerados como preparatórios e ac	100,00	ml	70,07	2 d	1	100	70%	100	1,43 d	Ter 21/02/17	Qua 22/02/17	43										
45	3.7.4 Abertura de caixa em terreno de qualquer natureza na espessura de 0,20m, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa, o fornecimento e aplicação de betão com 0,10 m e o fornecimento e assentamento de pedra do chão retangular à cor natural com	820,00	m2	382,88	3 d	1	400	95%	400	2,14 d	Qui 23/02/17	Sáb 25/02/17	44										
46	3.7.5 Pintura de portão metálico, na entrada do Parque de Jogos, com esmalte, incluindo eventuais ajustamentos de serralharia e tratamento anti-corrosivo.	1,00	un	1,4	1 d	1	2	70%	2	0,71 d	Dom 26/02/17	Dom 26/02/17	45										
47	3.7.6 Lavagem de paredes exteriores, em muros de vedação, incluindo eventuais correções das superfícies areadas e pintura com tinta plástica, com as demãos necessárias ao acabamento final conveniente.	950,00	m2	443,58	3 d	1	500	88%	500	2,14 d	Seg 27/02/17	Qua 01/03/17	46										
48	4 RECEPÇÃO				0 d					0 d	Qui 02/03/17	Qui 02/03/17	5										

LEGENDA:

Tarefa Tarefa Crítica Marco Tarefa Sumário Resumo de Projecto Tarefa Manual Progresso Manual
