


PROGRAMA DE TRABALHOS - CAMINHO CRITICO



| ID | Designação                                                                                           | Un | Quant.   | Duração | Início | Conclusão | Rend. Prático (Un/dia) | Σ Coef.(s) ub-Produçã | Rend. Teórico (Un/dia) | EQUIPAS / FRENTES         | Precedencias | Sucessoras              | 1 | S-2 | S-1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|--------|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|---|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1  | "INSTALAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DO PARQUE DE JOGOS DE FORNELO"        |    |          | 75 d    | 01-05  | 14-07     |                        |                       |                        |                           |              |                         |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 2  | Consignação e entrega do Plano de Trabalhos Definitivo                                               |    |          | 0 d     | 01-05  | 01-05     |                        |                       |                        |                           |              | 5                       |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 3  | TRABALHOS RELATIVOS À EMPREITADA                                                                     |    |          | 75 d    | 01-05  | 14-07     |                        |                       |                        |                           |              |                         |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 4  | 1. TRABALHOS PRELIMINARES                                                                            |    |          | 75 d    | 01-05  | 14-07     |                        |                       |                        |                           |              |                         |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 5  | 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalação de redes provisórias, instalações c    | un | 1,00     | 75 d    | 01-05  | 14-07     | 0,01                   | 0,25                  | 0,02                   | EQ. ESTALEIRO             |              | 2 11II+2 d;76II+5 d;93  |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 6  | 2. DEMOLIÇÕES                                                                                        |    |          | 8 d     | 03-05  | 10-05     |                        |                       |                        | FRENTE 1.1                |              |                         |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 7  | 2.1 Demolição de canais de drenagem de águas pluviais em betão e respectivas fundações em betão      | ml | 299,80   | 3 d     | 06-05  | 08-05     | 99,93                  | 0,25                  | 124,92                 | EQ. DEMOLIÇÕES            |              | 8 10                    |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 8  | 2.2 Demolição parcial de alvenaria em blocos de betão na lateral do campo, para colocação de port    | m2 | 2,20     | 1 d     | 05-05  | 05-05     | 2,2                    | 0,25                  | 2,75                   | EQ. DEMOLIÇÕES            |              | 9 7                     |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 9  | 2.3 Execução de demolição de murete e pavimento para as novas medidas dos bancos de suplentes        | un | 2,00     | 1 d     | 04-05  | 04-05     | 2                      | 0,25                  | 2,5                    | EQ. DEMOLIÇÕES            |              | 11 8                    |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 10 | 2.4 Demolição de torre de iluminação, incluindo desactivação, remoção e acondicionamento de eq       | un | 1,00     | 2 d     | 09-05  | 10-05     | 0,5                    | 0,25                  | 0,63                   | LIÇÕES / EQ. ELETRICIDADE |              | 7 13                    |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 11 | 2.5 Remoção das balizas existentes, assim como maciços em betão ciclópico incluindo depósito a va    | un | 2,00     | 1 d     | 03-05  | 03-05     | 2                      | 0,25                  | 2,5                    | EQ. REMOÇÃO EQUIP.        |              | 5II+2 d 9               |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 12 | 3. MOVIMENTO DE TERRAS                                                                               |    |          | 40 d    | 11-05  | 19-06     |                        |                       |                        | FRENTE 1.2 / FRENTE 1.6   |              |                         |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 13 | 3.1 Escavação em terreno de qualquer natureza na área de intervenção, até às cotas de fundo de ca    | m3 | 1.040,00 | 7 d     | 11-05  | 17-05     | 148,57                 | 0,25                  | 185,71                 | EQ. ESC. SOLOS            |              | 10 17                   |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 14 | 3.2 Regularização, compactação e reperfilamento de toda a área do recinto de jogo, incluindo form    | m2 | 5.200,00 | 13 d    | 07-06  | 19-06     | 400                    | 0,25                  | 500                    | EQ. AGREGADOS             |              | 16;21 38                |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 15 | 4. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                                                        |    |          | 15 d    | 18-05  | 01-06     |                        |                       |                        | FRENTE 1.3                |              |                         |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 17 | 4.2 Fornecimento e colocação de tubagem em polipropileno (PP corrugado, SN 8 KN / m2 ), diâm. 2      | ml | 220,00   | 10 d    | 18-05  | 27-05     | 22                     | 0,25                  | 27,5                   | EQ. VALA DRENAGEM         |              | 13 21;19II+3 d;18CC;160 |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 20 | 5 SISTEMA DE REGA                                                                                    |    |          | 15 d    | 28-05  | 11-06     |                        |                       |                        | FRENTE 1.4                |              |                         |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 21 | 5.1 Abertura, tapamento de vala de perfil D: (L) 0,5m x (P) 0,8m, incluindo: transporte para vazadou | ml | 430,00   | 10 d    | 28-05  | 06-06     | 43                     | 0,25                  | 53,75                  | EQ. VALA REGA             |              | 17 23II;85;14;34CC;28II |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 37 | 6. RELVA SINTÉTICA                                                                                   |    |          | 25 d    | 20-06  | 14-07     |                        |                       |                        | FRENTE 1.7 / FRENTE 1.9   |              |                         |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 38 | 6.1 Fornecimento e instalação de relva sintética . Fibras monofilamento, bicolor (verde claro e escu | m2 | 5.200,00 | 20 d    | 20-06  | 09-07     | 260                    | 0,25                  | 325                    | EQ. RELVA SINTÉTICA       |              | 14 42CC-1 d;39          |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 39 | 6.2 Execução de ensaio de campo por laboratório acreditado pela FIFA, emissão de respetivo certifi   | un | 1,00     | 5 d     | 10-07  | 14-07     | 0,2                    | 0,25                  | 0,25                   | EQ. CERTIFICAÇÃO          |              | 38 93                   |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |
| 93 | RECEPÇÃO PROVISÓRIA                                                                                  |    |          | 0 d     | 14-07  | 14-07     |                        |                       |                        |                           |              | 5;39                    |   |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |

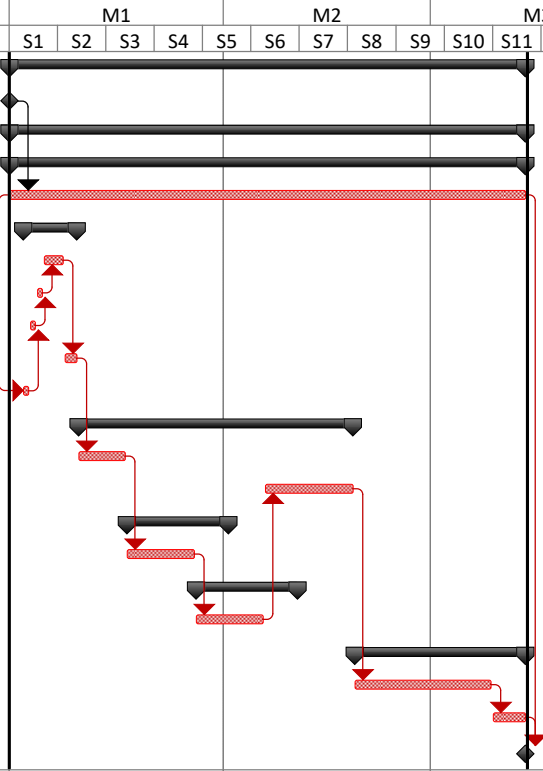

Tarefa

Tarefa Crítica

Marco

Sumário

Tarefa Crítica Agregada

Dividir
