

PLANO DE PAGAMENTOS

EMPREITADA "ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO - BAGUNTE"

Artigo	Descrição dos trabalhos	Valor total	Data		2020			
			Início	Fim	Junho	Julho	Agosto	Setembro
					Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
C1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS							
1.1	Estaleiro - Montagem, exploração, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução dos trabalhos da empreitada, conforme o Projeto. a) Aplicam-se a todos os trabalhos que constituem a empreitada.	1.000,00 €	Seg 01/06/20	Seg 28/09/20	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
1.2	Plano de Segurança - Execução do desenvolvimento, alterações e especificações do plano de segurança e saúde em projeto, e aplicação do plano de segurança e saúde para a execução da obra, após aprovação do dono da obra, de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/	250,00 €	Seg 01/06/20	Qua 30/09/20	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
1.3	Plano de Prevenção e Gestão RCD - Execução e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, incluindo a mobilização de mão-de-obra e equipamentos necessários para a carga, transporte e descarga para vazadouro, de tod	250,00 €	Seg 01/06/20	Qua 30/09/20	62,50 €	62,50 €	62,50 €	62,50 €
1.4	Painel identificativo da obra - Fornecimento e montagem de painel identificativo da obra, executado de acordo com layout pré-definido, em chapa metálica galvanizada e fixos a prumos galvanizados Ø50mm, com as dimensões de 200x100cm, incluindo todos os mat	250,00 €	Seg 01/06/20	Seg 01/06/20	250,00 €			
1.5	Limpeza - Execução de limpeza geral de todos os espaços da área de intervenção da empreitada, necessária para a realização da receção provisória, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos inerentes. a) A aplicar em toda a área de intervenção	250,00 €	Ter 29/09/20	Qua 30/09/20				250,00 €
C2	ARRANJOS EXTERIORES							
2.1	Demolições e Movimento de Terras							
2.1.1	Execução de demolições e levantamentos necessários para o cumprimento do definido em projeto de arquitetura, incluindo a carga, transporte e descarga a depósito do Dono de Obra dos materiais com interesse por parte deste, nesse caso, deverão ser descarreg							
	- Pavimentos existentes nos arruamentos (calçada)	810,00 €	Qua 03/06/20	Sex 19/06/20	810,00 €			
	- Pavimentos existentes nos arruamentos (cubo de granito)	290,00 €	Qua 03/06/20	Sex 19/06/20	290,00 €			
	- Pavimentos existente no passeio (betonilha)	60,00 €	Qua 03/06/20	Sex 19/06/20	60,00 €			
2.1.2	Demolição da totalidade do muro existente em pedra, necessário para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, em conformidade com o projeto e nas condições do Caderno de Encargos.	2.635,00 €	Qua 03/06/20	Sex 03/07/20	2.371,50 €	263,50 €		
2.1.3	Demolição da construção anexa, com um piso, necessário para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, em conformidade com o projeto e nas condições do Caderno de Encargos. a) A apli							
	- Pavimento	125,00 €	Seg 06/07/20	Ter 07/07/20		125,00 €		
	- Cobertura	125,00 €	Seg 06/07/20	Ter 07/07/20		125,00 €		
	- Paredes	350,00 €	Seg 06/07/20	Ter 07/07/20		350,00 €		
2.1.4	Remoção das caixas de correio existentes, necessário para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, em conformidade com o projeto e nas condições do Caderno de Encargos. a) A aplica	50,00 €	Qua 03/06/20	Qua 03/06/20	50,00 €			
2.1.5	Execução de corte de terreno para implantação da área de intervenção e muros, em escavação de solos de natureza diversa, de acordo com o existente no local, incluindo entivação e escoramentos necessários, carga, transporte e remoção para vazadouro dos produtos em excesso ou não selecionáveis para aplicação em aterros, de acordo com o projecto e as seguintes características dos solos:							
2.1.5.1	- decapagem de camada de terra vegetal com esp. média de 0,75m.	776,70 €	Qua 03/06/20	Sex 03/07/20	699,03 €	77,67 €		
2.1.5.2	- escavação em solos residuais graníticos.	2.844,00 €	Qua 03/06/20	Sex 03/07/20	2.559,60 €	284,40 €		
2.1.5.3	- escavação em rocha granítica.	4.740,00 €	Qua 03/06/20	Sex 03/07/20	4.266,00 €	474,00 €		
2.1.6	Execução de aterro no tardo dos muros suporte, compactado, através do espalhamento de camadas com espessura não superior a 30cm, quantas vezes for necessário até atingir as cotas de projeto, com materiais selecionáveis resultantes da escavação ou de empréstimo, incluindo a reposição da camada de terra vegetal numa espessura média de 0,75m, com todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, em conformidade com o projeto e nas condições do Caderno de Encargos. a) A aplicar no tardo dos novos muros a construir.	2.450,00 €	Seg 08/06/20	Sex 11/09/20	1.680,00 €	770,00 €		
2.2	Pavimentos Exteriores							

PLANO DE PAGAMENTOS

EMPREITADA "ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO - BAGUNTE"

Artigo	Descrição dos trabalhos	Valor total	Data		2020			
			Início	Fim	Junho	Julho	Agosto	Setembro
					Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
2.2.1	Execução de abertura de caixa para execução das bases de pavimentos e acerto de cotas de implantação, com 40cm de espessura média, incluindo compactação da base, necessária para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, com todos os materiais e trabalh	1.710,00 €	Seg 06/07/20	Sex 24/07/20		1.710,00 €		
2.2.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant, com 30cm de espessura após rega e compactação, necessária para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, com todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, em conformidade com o projeto e	3.933,00 €	Seg 06/07/20	Sex 24/07/20		3.933,00 €		
2.2.3	Execução de base em massame de betão, com 10cm de espessura, armado com malhasol CQ38, necessária para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, com todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, em conformidade com o projeto e nas condiç	560,00 €	Seg 06/07/20	Sex 24/07/20		560,00 €		
2.2.4	Assentamento de cubos em granito, dimensão de 11x11cm, de 1ª escolha, de tonalidade azul, provenientes do levantamento, assentes sobre uma camada de areia de granulometria compreendida entre 0,5 e 5 mm, com 10cm de espessura, deixando entre eles uma junta	1.160,00 €	Seg 27/07/20	Sex 31/07/20		1.160,00 €		
2.2.5	Fornecimento e assentamento de cubos em granito, dimensão de 11x11cm, de 1ª escolha, de tonalidade azul, assentes sobre uma camada de areia de granulometria compreendida entre 0,5 e 5 mm, com 10cm de espessura, deixando entre eles uma junta de separação	9.230,00 €	Seg 03/08/20	Sex 18/09/20			5.914,20 €	3.315,80 €
2.2.6	Fornecimento e assentamento de pavimento em lajeado de granito cinza claro, 10cm de espessura, comprimentos de acordo com a estereotomia em planta, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo base de assentamento em betão da classe C20/25, com alt	405,00 €	Ter 11/08/20	Ter 11/08/20			405,00 €	
2.2.7	Execução de pavimento em betonilha e aplicação de argamassa de regularização com espessura média de 4cm, (argamassa pré-doseada de betonilha, formulada a partir de ligantes hidráulicos, agregados calcários e silicosos), necessária para o bom cumprimento d	60,00 €	Seg 10/08/20	Seg 10/08/20			60,00 €	
2.2.8	Fornecimento e assentamento de lancis em betão, retos e curvos, dimensão 12x15x25x11x100cm, assente com argamassa de cimento e areia, incluindo base de assentamento em betão da classe C20/25, com altura mínima de 20cm, necessária para o bom cumprimento do							
	- Guias retas	143,00 €	Seg 03/08/20	Sex 07/08/20			143,00 €	
	- Guias curvas	22,00 €	Seg 03/08/20	Sex 07/08/20			22,00 €	
2.2.9	Fornecimento e assentamento de rampas recuadas, esquerda, direita, (40x25x100cm), comprimento total 200cm, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo base de assentamento em betão da classe C20/25, com altura mínima de 20cm, necessária para o bo							
	- Guias rampeadas retas	100,00 €	Seg 03/08/20	Sex 07/08/20			100,00 €	
2.3	Muros							
2.3.1	Execução de muro de suporte em betão ciclópico, constituído por betão simples da classe de resistência C16/20 e incorporação de pedra de granito sã de dimensão máxima 25cm em percentagem não superior a 35% em volume, com 0,40m de espessura na secção super	41.625,00 €	Seg 08/06/20	Sex 11/09/20	11.320,27 €	13.257,77 €	13.257,77 €	3.789,19 €
2.3.2	Fornecimento e aplicação de geodreno de parede dupla em PVC Ø110mm no tardo do muro de suporte, necessária para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, com todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, em conformidade com o projeto e	2.750,00 €	Seg 08/06/20	Sex 11/09/20	711,56 €	859,06 €	859,06 €	320,32 €
2.4	Acesso ao Cemitério							
2.4.1	Corte do degrau exterior em granito, necessário para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, necessária para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, em conformidade com o pro	132,00 €	Qua 12/08/20	Qua 12/08/20			132,00 €	
2.4.2	Demolição do degrau interior, necessário para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, em conformidade com o projeto e nas condições do Caderno de Encargos. a) A aplicar no interio	80,00 €	Qua 12/08/20	Qua 12/08/20			80,00 €	

PLANO DE PAGAMENTOS

EMPREITADA "ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO - BAGUNTE"

Artigo	Descrição dos trabalhos	Valor total	Data		2020			
			Início	Fim	Junho	Julho	Agosto	Setembro
					Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
2.4.3	Levantamento e remoção de pavimento em microcubo de granito, incluindo remoção de grelha existente, necessário para o bom cumprimento do projeto de arquitetura, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do	175,00 €	Qui 13/08/20	Qui 13/08/20			175,00 €	
2.4.4	Execução enchimento e aterro com tout-venant e brita (15/30) com espessura variável para formação da pendente da rampa e degraus, incluindo regularização da base, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme o projeto e as especificações do Cade	152,00 €	Qui 13/08/20	Qui 13/08/20			152,00 €	
2.4.5	Fornecimento e execução de camada em betonilha pré doseada armada com malha de rede electro-soldada AQ 30, com 7cm de espessura máxima, perfeitamente nivelada e regularizada, e com acabamento final atalochado, com todos os materiais e trabalhos inerentes	112,50 €	Sex 14/08/20	Sex 14/08/20			112,50 €	
2.4.6	Fornecimento e aplicação de placagem de granito amarelo bujardado a pico fino, com 3 cm de espessura, de cor homogénea, sem manchas, colado à base em betão com cola do tipo “WEBER.COL.FLEX XL”, ou equivalente, com todos os materiais e trabalhos inerentes	675,00 €	Seg 17/08/20	Ter 18/08/20			675,00 €	
2.4.7	Fornecimento e aplicação de placagem de granito amarelo bujardado a pico fino, com 2 cm de espessura, de cor homogénea, sem manchas, colado à base em betão com cola do tipo “WEBER.COL.FLEX XL”, ou equivalente, com todos os materiais e trabalhos inerentes	120,00 €	Qua 19/08/20	Qua 19/08/20			120,00 €	
2.4.8	Fornecimento e assentamento de contragrua em granito amarelo, com 20cm de largura, 10cm de espessura, comprimento de 100cm, colado à base em betão com cola do tipo “WEBER.COL.FLEX XL”, ou equivalente, incluindo base de assentamento em betão da classe C20/	126,00 €	Qui 20/08/20	Qui 20/08/20			126,00 €	
2.4.9	Fornecimento e assentamento de soleira em granito cinzento, com comprimento total do vão, largura de 40cm e 10cm de espessura, colado à base em betão com cola do tipo “WEBER.COL.FLEX XL”, ou equivalente, incluindo base de assentamento em betão da classe C	242,00 €	Sex 21/08/20	Sex 21/08/20			242,00 €	
C3	REVESTIMENTO DE PAREDES							
3.1	Picagem, remoção do reboco existente e limpeza geral da parede, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme os desenhos de projeto, e nas condições do Caderno de Encargos. a) A aplicar no painel existente no muro da fonte.	72,60 €	Seg 24/08/20	Seg 24/08/20			72,60 €	
3.2	Fornecimento e execução de salpisco, ceresite, emboço de regularização com acabamento areado, com argamassa pré doseada, prontos a receber pintura (moldura do painel) e revestimento de azulejo (fundo do painel), incluindo todos os materiais e trabalhos in	72,60 €	Ter 25/08/20	Ter 25/08/20			72,60 €	
3.3	Execução de limpeza de toda a sujidade orgânica de fungos, poeira, escorridos e resíduos de cimento, em todas a peças e elementos de granito, com detergente alcalino forte, tipo “LABO PIERRE”, ou equivalente, incluindo picagem de argamassa existente nas j	70,00 €	Qua 26/08/20	Qua 26/08/20			70,00 €	
3.4	Execução de reparação e preenchimento de juntas com pedras de granito com acabamento em junta seca, a executar nas paredes e " mesa " da base da fonte após a limpeza incluindo, com todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme os desenhos de projeto,	70,00 €	Qui 27/08/20	Qui 27/08/20			70,00 €	
3.5	Fornecimento e aplicação de um produto hidrófugo de superfícies, do tipo “HYDROFUGE HS DA LABO PORTUGAL”, ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, conforme os desenhos de projeto, e nas condições do Caderno de Encargos. a) A apl	34,20 €	Sex 28/08/20	Sex 28/08/20			34,20 €	
3.6	Fornecimento e aplicação de azulejo liso tipo “Azulima” ou equivalente, semi-manual de cor branca F41, com dimensões de 14x14cm, inclui a colagem com cola do tipo “Weber.cool flex M”, ou equivalente, e betumação das juntas com argamassa colorida de acabam	110,00 €	Seg 31/08/20	Seg 31/08/20			110,00 €	
C4	SERRALHARIAS							
4.1	Fornecimento e assentamento de portão exterior, de dupla folha, de batente, em perfis tubulares em ferro, metalizado (40microns), com dimensão de 2,50x2,00m, composto por tubulares 80x40x2mm, cantoneiras de abas desiguais 20x50x5mm, com todos os mecanismo	1.700,00 €	Seg 21/09/20	Seg 21/09/20				1.700,00 €

PLANO DE PAGAMENTOS

EMPREITADA "ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO - BAGUNTE"

Artigo	Descrição dos trabalhos	Valor total	Data		2020			
			Início	Fim	Junho	Julho	Agosto	Setembro
					Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
4.2	Fornecimento e assentamento de porta em perfis tubulares em ferro, metalizado (40microns), com dimensão total do vão com 1,25x1,02m, composto por tubulares 80x40x2mm, cantoneiras de abas desiguais 20x50x5mm, com todos os mecanismos de fixação, abertura e	465,00 €	Ter 22/09/20	Ter 22/09/20				465,00 €
4.3	Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas, de batente, em perfis em ferro, metalizado (40microns), com desenho idêntico ao existente, com todos os mecanismos de fixação, abertura e fecho, com todos os trabalhos e materiais inerentes, de acordo c	1.900,00 €	Qua 23/09/20	Qua 23/09/20				1.900,00 €
4.4	Fornecimento e aplicação de guardas em perfis tubulares em ferro, metalizado (40microns), com altura de 900mm, composto por passa-mãos (tubulares 30x30x2mm), prumos (tubulares 30x30x2mm), fixações, chumbadouros, pateres em chapa de ferro metalizado 70x70x	604,00 €	Qui 24/09/20	Qui 24/09/20				604,00 €
4.5	Fornecimento e aplicação de tubos em aço inox AISI 316, com secção de 60mm, em substituição dos existentes em pvc, incluindo a remoção dos existentes, regularização da superfície de acordo com o descrito no art. 3.4), com todos os materiais e trabalhos in	180,00 €	Sex 25/09/20	Sex 25/09/20				180,00 €
C5	PINTURAS E ACABAMENTOS FINAIS							
5.1	Execução de pintura com tinta aquosa mate, 100% acrílica, tipo “Novaqua HD”, ou equivalente, com cor a definir pela Equipa Projetista, incluindo aplicação de uma demão de primário tipo “Cinolite”, ou equivalente, com todos os materiais e trabalhos inerent	55,00 €	Ter 01/09/20	Ter 01/09/20				55,00 €
5.2	Execução de pintura com tinta de esmalte sintético tipo gel formulado com pigmentos anti-corrosivos, para aplicação direta ao ferro, tipo “CinoforForja”, ou equivalente, aplicado em duas demãos, com cor a definir pela Equipa Projetista, incluindo todos os							
	- Guarda da Rampa do Cemitério	188,75 €	Qua 23/09/20	Sex 25/09/20				188,75 €
	- Portão P3, no Cemitério	100,00 €	Qua 23/09/20	Sex 25/09/20				100,00 €
	- Elementos metálicos do Portão P1	150,00 €	Qua 23/09/20	Sex 25/09/20				150,00 €
	- Elementos metálicos do Portão P2	100,00 €	Qua 23/09/20	Sex 25/09/20				100,00 €
5.3	Fornecimento e execução de envernizamento com verniz solvente do tipo “SPAR Resistência Extrema” da Robbialac, ou equivalente, aplicado em duas demãos, em cor a definir pela Equipa Projetista, incluindo aplicação de primário, com todos os materiais e trab							
	- Portão P1	150,00 €	Seg 28/09/20	Seg 28/09/20				150,00 €
	- Portão P2	100,00 €	Seg 28/09/20	Seg 28/09/20				100,00 €
C6	DIVERSOS							
6.1	Execução de todos os trabalhos necessários para alteração das cotas das caixas de especialidades existentes, para a nova cota dos novos passeios e arruamento, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, de acordo com o projeto e							
	- Tampa em Grelha	80,00 €	Seg 21/09/20	Ter 22/09/20				80,00 €
	- Tampa Redonda	80,00 €	Seg 21/09/20	Ter 22/09/20				80,00 €
	- Tampa Quadrada	80,00 €	Seg 21/09/20	Ter 22/09/20				80,00 €
6.2	Execução de todos os trabalhos necessários para alteração da localização e instalação das caixas de correio existentes, para junto do novo muro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à sua boa execução, de acordo com o projeto e nas condições	150,00 €	Seg 28/09/20	Seg 28/09/20				150,00 €
C7	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS							
7.1	Levantamentos e Pavimentações							
7.1.1	Levantamento de pavimento em cubo de granito existente, de forma cuidada para posterior seleção e aproveitamento, incluindo carga, transporte a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário ou em estaleiro de obra, bem como, todos os procedimentos necess	50,00 €	Qua 03/06/20	Seg 15/06/20	50,00 €			
7.1.2	Assentamento de cubos em granito provenientes do levantamento, assentes sobre almofada de areia com 0,10m de espessura, incluindo espalhamento de areia sobre os cubos, compactação da base existente e execução de retificação de pendentes com tout-venant de	200,00 €	Ter 16/06/20	Sex 03/07/20	180,00 €	20,00 €		
7.2	Movimento de Terras							
7.2.1	Escavação em abertura de valas, para assentamento de tubagens e execução de caixas e sumidouros, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, em zona de agrícola de qualquer natureza.							

PLANO DE PAGAMENTOS

EMPREITADA "ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO - BAGUNTE"

Artigo	Descrição dos trabalhos	Valor total	Data		2020			
			Início	Fim	Junho	Julho	Agosto	Setembro
					Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
	a) - 50% em terra	975,00 €	Seg 08/06/20	Seg 29/06/20	975,00 €			
	b) - 50% em rocha dura	2.340,00 €	Seg 08/06/20	Seg 29/06/20	2.340,00 €			
7.2.2	Fornecimento e colocação de almofada de areia ou terra cirandada para envolvimento de tubagem.	920,00 €	Ter 09/06/20	Ter 30/06/20	920,00 €			
7.2.3	Aterro com terras provenientes da escavação ou de empréstimo, isentos de pedras, torrões compactos e raízes em camadas bem compactadas de espessura não superior a 0,20 m, incluindo carga, transporte, descarga, rega e compactação mecânica.	820,00 €	Ter 09/06/20	Ter 30/06/20	820,00 €			
7.2.4	Remoção e transporte a depósito do empreiteiro dos produtos sobranes, considerando um coeficiente de empolamento médio de 15%.	422,00 €	Qua 01/07/20	Sex 03/07/20		422,00 €		
7.3	Tubagens e Acessórios							
7.3.1	Fornecimento e assentamento de tubagem de drenagem de águas pluviais, em Polipropileno corrugado SN8, incluindo todos os acessórios e trabalhos e materiais inerentes à sua correta execução, nos seguintes diâmetros:							
	c) - Ø 315mm	2.030,00 €	Ter 09/06/20	Ter 30/06/20	2.030,00 €			
	d) - Ø 200mm	2.280,00 €	Ter 09/06/20	Ter 30/06/20	2.280,00 €			
7.3.2	Fornecimento e aplicação de entroncamento em clipe a 45º em PVC Corrugado DN 315/200, para ligação de tubagens.	175,00 €	Ter 09/06/20	Ter 30/06/20	175,00 €			
7.4	Caixas, Sumidouros e Grelhas							
7.4.1	Execução de câmara de visita composto por elementos pré-fabricados de betão simples, de 1,20m de diâmetro interior e 1,60m de altura útil interior de acordo com o perfil da rede, formada por: base de 25 cm de espessura de betão armado C16/20 ligeiramente	2.400,00 €	Ter 09/06/20	Ter 30/06/20	2.400,00 €			
7.4.2	Fornecimento e montagem de sumidouro pré-fabricado de betão fck=25 MPa, de 60x30x75 cm de medidas interiores, para recolha de águas pluviais, colocado sobre base de betão simples C16/20 de 10 cm de espessura e grelha de ferro fundido cinzento dúctil norma	2.040,00 €	Ter 09/06/20	Ter 30/06/20	2.040,00 €			
7.4.3	Execução de canal em betão com betão C16/20 executado " in situ " com largura máxima de 0,20m e 3,0m comprimento, incluindo grelha em ferro galvanizado com dimensões de acordo com os desenhos, assente sobre base compactada, incluindo todos os trabalhos de	240,00 €	Qua 01/07/20	Qui 02/07/20		240,00 €		
TOTAIS					39.652,96 €	25.006,40 €	23.379,93 €	14.133,06 €

Vila do Conde, 18 de Maio de 2020


EMPREITADA "ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO - BAGUNTE"

PLANO DE PAGAMENTOS

MÊS	TOTAL (€)	
	VALOR MENSAL	VALOR ACUMULADO
1º Mês	39.652,96 €	39.652,96 €
2º Mês	25.006,40 €	64.659,36 €
3º Mês	23.379,93 €	88.039,29 €
4º Mês	14.133,06 €	102.172,35 €

TOTAL DA EMPREITADA

102.172,35 €

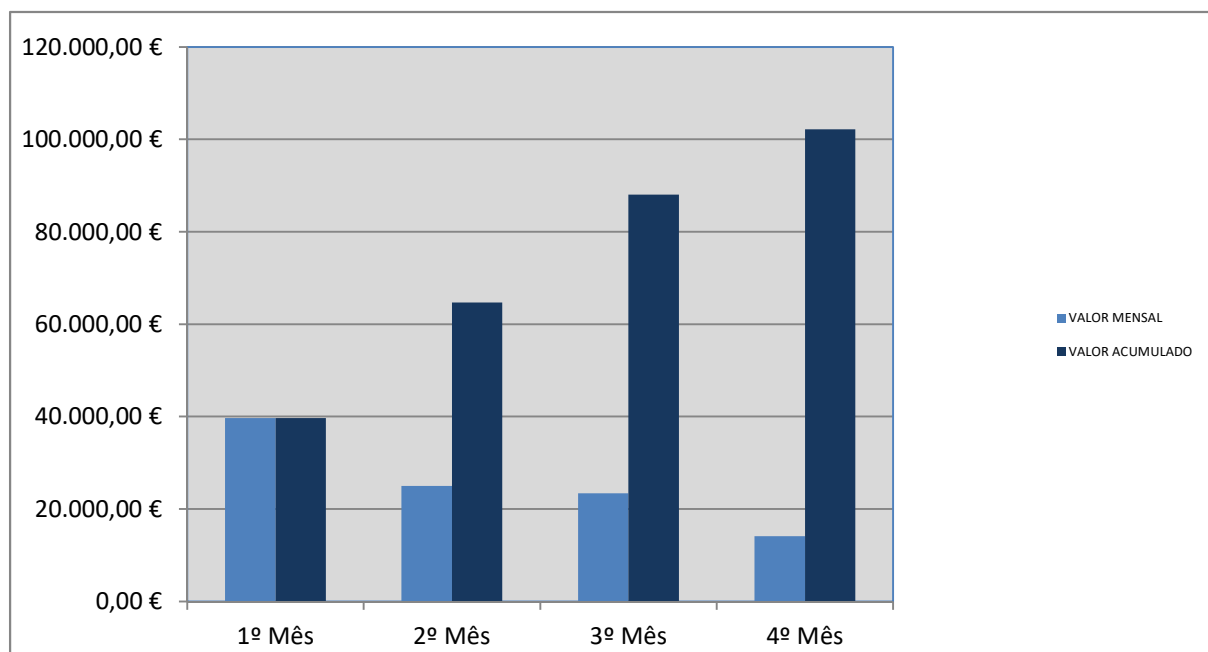


Vila do Conde, 18 de Maio de 2020

EMPREITADA "ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 5 DE OUTUBRO - BAGUNTE"

CRONOGRAMA FINANCEIRO

MÊS	TOTAL (%)	
	VALOR MENSAL	VALOR ACUMULADO
1º Mês	38,80%	38,80%
2º Mês	24,47%	63,27%
3º Mês	22,88%	86,15%
4º Mês	13,85%	100,00%

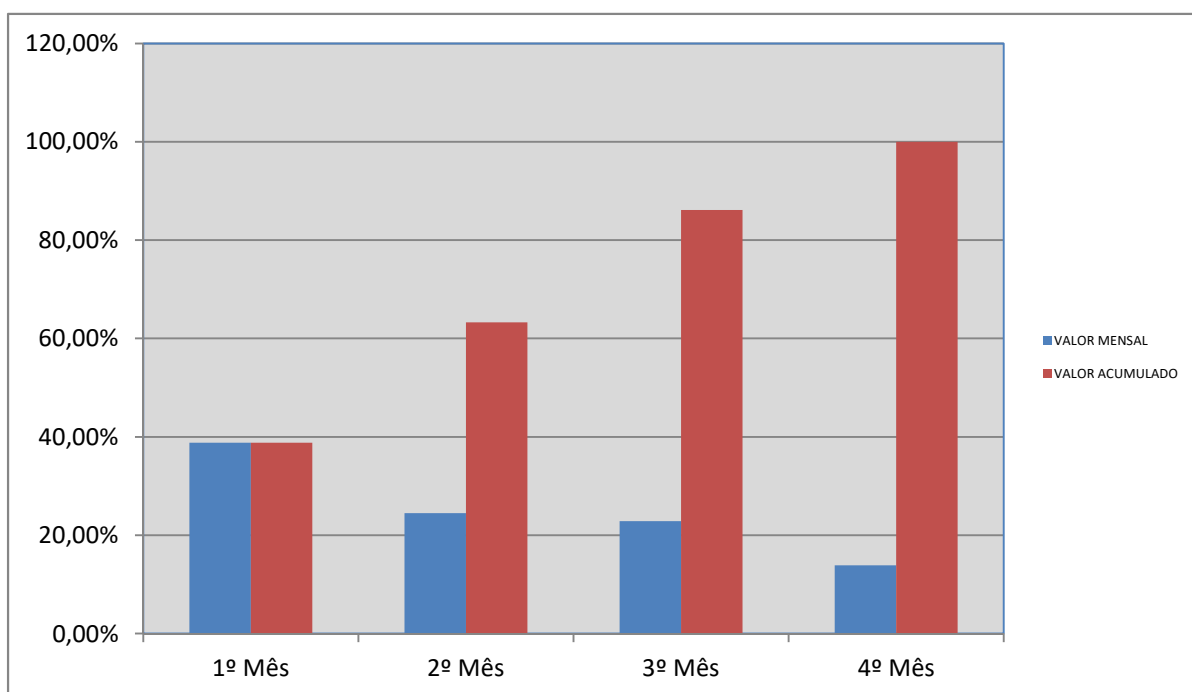

Vila do Conde, 18 de Maio de 2020
