PLANO DE TRABALHOS - CAMINHO CRÍTICO

Prazo de execução: 12 Meses

CLIENTE: Município de Fafe

OBRA: "Reabilitação do Espaço Público da Zona Envolvente ao Bairro da Cumieira - Fafe"

ID	Art.	Designação	Und.	Quant.	Duração	Rend./ dia	Início	Conclusão	Precedências	Sucessoras	Equipas de trabalho
2		**Requalificação Do Ringue de Canidelo - Pavilhão Desportivo Municipal de Canidelo**		**0**	**270 dias**	**0**	**02/11/20**	**29/07/21**			
3	**1**	**ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS**		**0**	**270 dias**	**0**	**02/11/20**	**29/07/21**			
4	1.1	Fornecimento e montagem de estaleiro da obra de acordo com o Art. 350.º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro e satisfazendo as prescrições relativas às instalações provisórias regulamentada pelo Decreto Lei nº 46427, de 10 julho de 1965, incluindo	Cj.	1	1 dia	1	02/11/20	02/11/20		5II;9II;10;11;6;7	Equipa de Estaleiro
5	1.2	Execução de manuntenção e exploração do estaleiro durante a execução da empreitada, acrescido de um período de 1 mês, incluindo todos os encargos dai decorrentes, designadamente alocação de mão de obra, máquinas e equipamentos, consumos de água, eletricid	Cj.	1	270 dias	0	02/11/20	29/07/21	4II		Equipa de Estaleiro
6	1.3	Exexução de implementação no decorrer da Empreitada de do Plano de Segurança e Saúde da Empreitada em conformidade com o estipulado no Decreto Lei nº 273/2003 de 29 de outubro, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos de proteção coletiva e	Cj.	1	269 dias	0	03/11/20	29/07/21	4		Equipa de Estaleiro
8	1.5	Execução de desmontagem e remoção do e estaleiro da Empreitada de acordo com o Art. 350.º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, incluindo a remoção e demolições de todos os elementos constituintes do estaleiro, reposição do terreno e das situações	Cj.	1	1 dia	1	29/07/21	29/07/21	226	360CC	Equipa de Estaleiro
11	1.8	Execução de marcação da obra, em todas as suas vertentes (fundações, est	Cj.	1	119 dias	0,01	03/11/20	01/03/21	4	13II+2 dias	
12	**2**	**ESTABILIDADE E BETÃO ARMADO Nota: Fornecimento, execução, assentamento e colocação de acordo com o projeto dos seguintes materiais, incluindo todos os fornecimentos e ações acessórias e complementares necessárias para um bom acabamento final:**		**0**	**139 dias**	**0**	**05/11/20**	**23/03/21**			
13	2.1	Fornecimento e aplicação de camada de betão de limpeza e nivelamento da base da fundação, com 10 cm de espessura em betão C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0), fabricado em central e betonagem desde camião, no fundo da escavação previamente realizada, incluind	m3	31,78	3 dias	10,59	05/11/20	07/11/20	11II+2 dias	14CI-2 dias	Equipa de estruturas de Betão
14	2.2	Fornecimento e execução de sapata de betão armado, realizada com betão	m3	115,84	35 dias	3,31	06/11/20	10/12/20	13CI-2 dias	15II+5 dias;16II+5 dias	uipa de estruturas de Bet
28	**3**	**ESTRUTURA METÁLICA Nota: Fornecimento, execução, assentamento e colocação de acordo com o projeto dos seguintes materiais, incluindo todos os fornecimentos e ações acessórias e complementares necessárias para um bom acabamento final:**		**0**	**76 dias**	**0**	**08/11/20**	**22/01/21**			
29	3.1	Fornecimento e assentamento, incluindo material e fabrico de estrutura metálica em aço S275JR, com aplicação de protecção anti-corrosiva com decapada ao grau SA 2 1/2, protecção anticorrosiva e ao fogo com aplicação de primário, com uma espessura média de	Cj	1	76 dias	0,01	08/11/20	22/01/21	14II+2 dias	60;26CI-7 dias;27CI-7 dias;61	Equipa de estrutura Metálica
59	**8**	**COBERTURAS Nota: Fornecimento, execução, assentamento e colocação de acordo com o projeto dos seguintes materiais, incluindo todos os fornecimentos e ações acessórias e complementares necessárias para um bom acabamento final:**		**0**	**35 dias**	**0**	**23/01/21**	**26/02/21**			
60	8.1	Fornecimento e montagem de cobertura sistema de Autoportante enformada a frio do tipo ou equivalente a "BLOCOTELHA - OMEGA BC114" de eixo curvilíneo, constituída por perfil com 1,50mm de espessura em chapa de aço qualidade Fe E250GD pré-lacada numa das fa	m2	1419	35 dias	40,54	23/01/21	26/02/21	29	75;76;73	Equipa de estrutura metálica

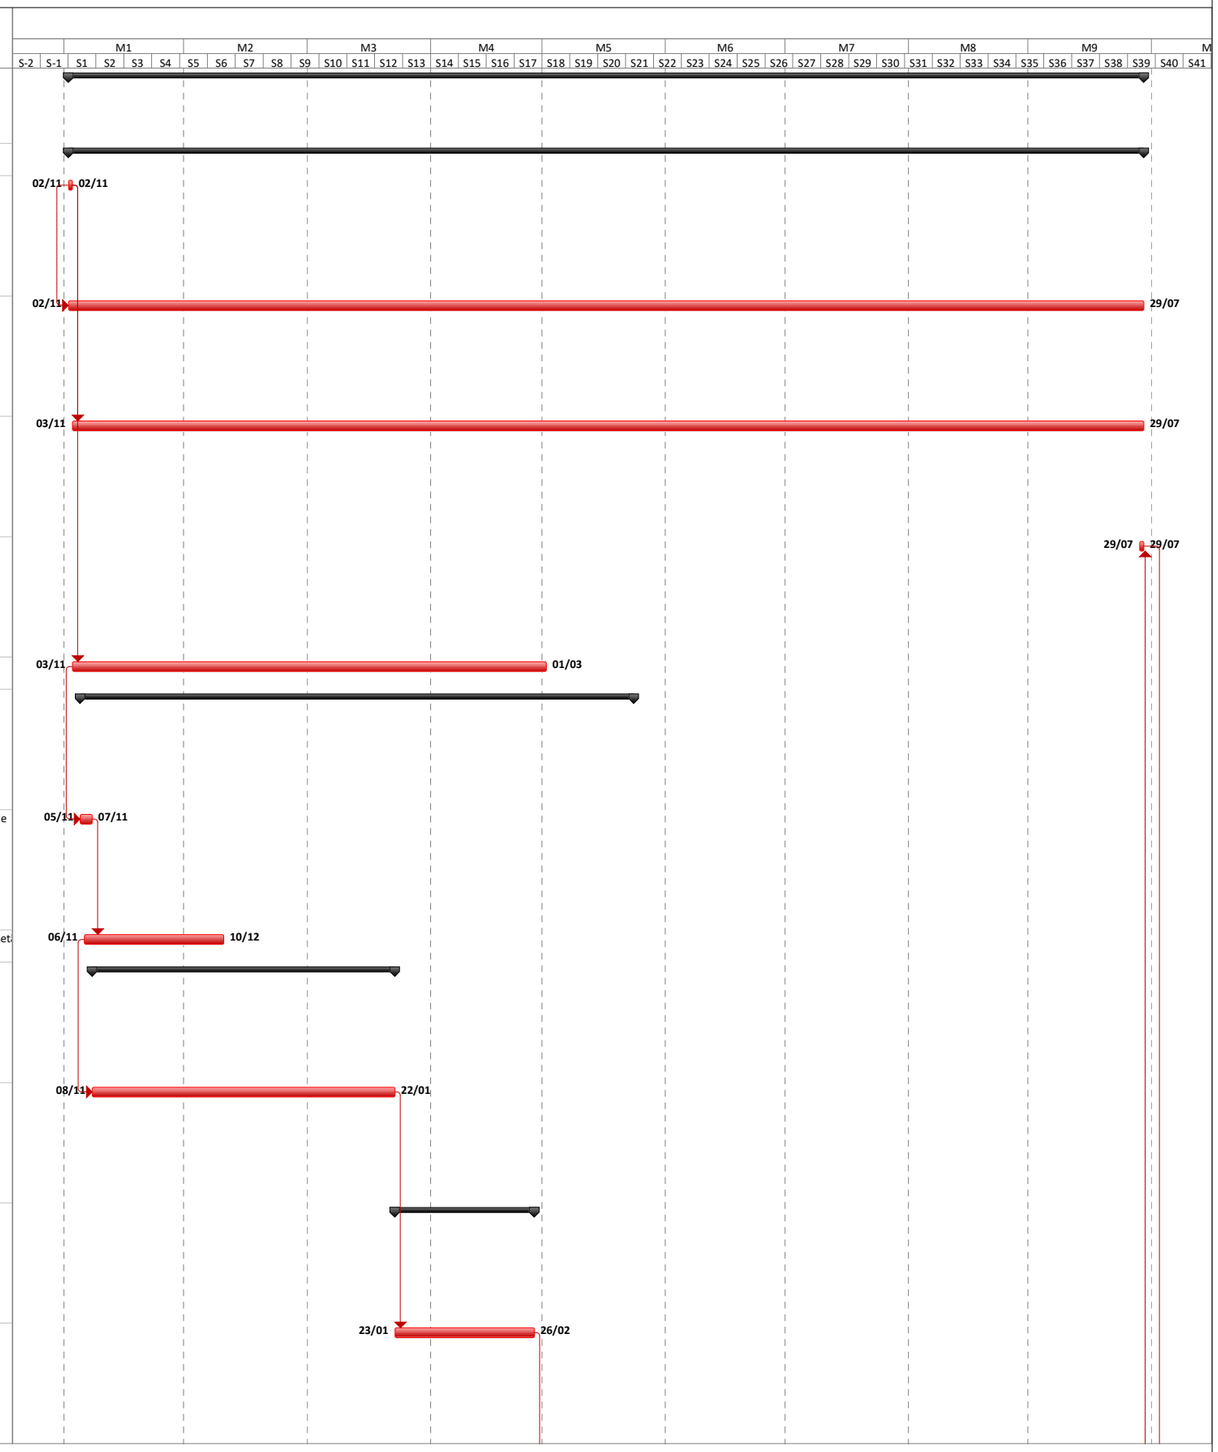

Tarefa | Tarefa Crítica | Marco | Sumário | Dividir

Assinado Por: RUI MANUEL DE FREITAS RODRIGUES

Data da Assinatura: 09/10/2020

CJR
CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, SA

PLANO DE TRABALHOS - CAMINHO CRÍTICO

Prazo de execução: 12 Meses

CLIENTE: Município de Fafe

OBRA: "Reabilitação do Espaço Público da Zona Envolvente ao Bairro da Cumieira - Fafe"

ID	Art.	Designação	Und.	Quant.	Duração	Rend./ dia	Início	Conclusão	Precedências	Sucessoras	Equipas de trabalho
71	**10**	**REVESTIMENTO DE PARAMENTOS E PROTEÇÕES PARIETAIS Nota: Fornecimento, execução, assentamento e colocação de acordo com o projeto dos seguintes materiais, incluindo todos os fornecimentos e ações acessórias e complementares necessárias para um bom acabament**		**0**	**88 dias**	**0**	**27/02/21**	**25/05/21**			
72	**10.1**	**Paramentos Exteriores**		**0**	**51 dias**	**0**	**27/02/21**	**18/04/21**			
73	10.1.1	Fornecimento e execução de revestimento de paramentos exteriores, constituido por salpisco em argamassa hidráulica do tipo ou equivalente a "SECIL ARGAMASSAS-CHAPISCO" e massas de enchimento e acabamento à base de reboco hidráulico projetado "RHP" do tipo	m2	588,41	51 dias	11,54	27/02/21	18/04/21	60	74CC;79;78;102II+15 dias;104II+15 dias;105II+15 dias;106II+15 dias;107II+15 dias;108II+15 dias;109II+15 dias;111II+15	Equipa de Revestimentos
77	**10.2**	**Paramentos Interiores**		**0**	**37 dias**	**0**	**19/04/21**	**25/05/21**			
79	10.2.2	Fornecimento e execução de revestimento de paramentos interiores, constituido por salpisco em argamassa hidráulica do tipo ou equivalente a "SECIL ARGAMASSAS-CHAPISCO" e massas de enchimento e acabamento à base de reboco hidráulico projetado "RHP" do tipo	m2	791,69	35 dias	22,62	19/04/21	23/05/21	73	86;87;80CC;88;89;95; dias;121II+5 dias;122II+5 dias	Equipa de Revestimentos
93	**12**	**REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS Nota: Fornecimento, execução, assentamento e colocação de acordo com o projeto dos seguintes materiais, incluindo todos os fornecimentos e ações acessórias e complementares necessárias para um bom acabamento final:**		**0**	**58 dias**	**0**	**24/05/21**	**20/07/21**			
94	**12.1**	**Pavimentos Interiores**		**0**	**58 dias**	**0**	**24/05/21**	**20/07/21**			
96	12.1.2	Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimento multidesportivos, constituido por tapete de borracha do tipo ou equivalente a "PAVISINT SL75 da CASALI SPORT", com 5mm de tapete de borracha e 2mm de resina poliuretânica multicamada, incluindo pint	m2	1035	16 dias	64,69	05/07/21	20/07/21	156	203	Equipa de equipamentos desportivos
152	**17**	**PINTURAS Nota: Fornecimento, aplicação de acordo com o projeto dos seguintes materiais, incluindo todos fornecimentos e ações acessórias e complementares necessárias para um bom acabamento final:**		**0**	**58 dias**	**0**	**24/05/21**	**20/07/21**			
155	**17.2**	**Paramentos Interiores**		**0**	**42 dias**	**0**	**24/05/21**	**04/07/21**			
156	17.2.1	Fornecimento e aplicação de pintura a tinta de esmalte aquoso 100% acrílica com acabamento acetinado de 1ª qualidade (nas cores defenidas em projeto) do tipo ou equivalente a "CIN-CINACRYL - ACETINADO - REFª 12-220" sobre superficies de paramentos interio	m2	791,69	42 dias	18,85	24/05/21	04/07/21	79	195CC-5 dias;206;208;157CC;9	Equipa de Revestimentos
196	**21**	**EQUIPAMENTO E MARCAÇÕES DESPORTIVAS Nota: Fornecimento, aplicação de acordo com o projeto dos seguintes materiais, incluindo todos fornecimentos e ações acessórias e complementares necessárias para um bom acabamento final:**		**0**	**4 dias**	**0**	**21/07/21**	**24/07/21**			
202	**21.2**	**Marcações Desportivo**		**0**	**3 dias**	**0**	**21/07/21**	**23/07/21**			
203	21.2.1	Fornecimento e aplicação de marcação de campo de jogo de futsal com dimensões 40x20mt (44x22mt) linhas amarelas ou vermelhas no pavimento do recinto interior, constituido por pintura a tinta aquosa de acrílico de poliuretano de um componente com acabament	Cj	1	3 dias	0,33	21/07/21	23/07/21	96	198;199;200;201;226	Equipa de Equipamentos deportivos
224	**23**	**APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL**		**0**	**66 dias**	**0**	**24/05/21**	**28/07/21**			
226	23.2	Execução de limpezas gerais de todas as áreas de intervenção que fazem parte integrante da empreitada, incluindo todos os equipamentos e consumiveis necessários à perfeita limpeza das superficies, conforme Caderno de Encargos (Critério de Medição: Área br	m2	1500	5 dias	300	24/07/21	28/07/21	203	227II;228II;8	Equipa de Limpeza
360		Recepção da Obra		0	0 dias	#ERRO	29/07/21	29/07/21	8CC		

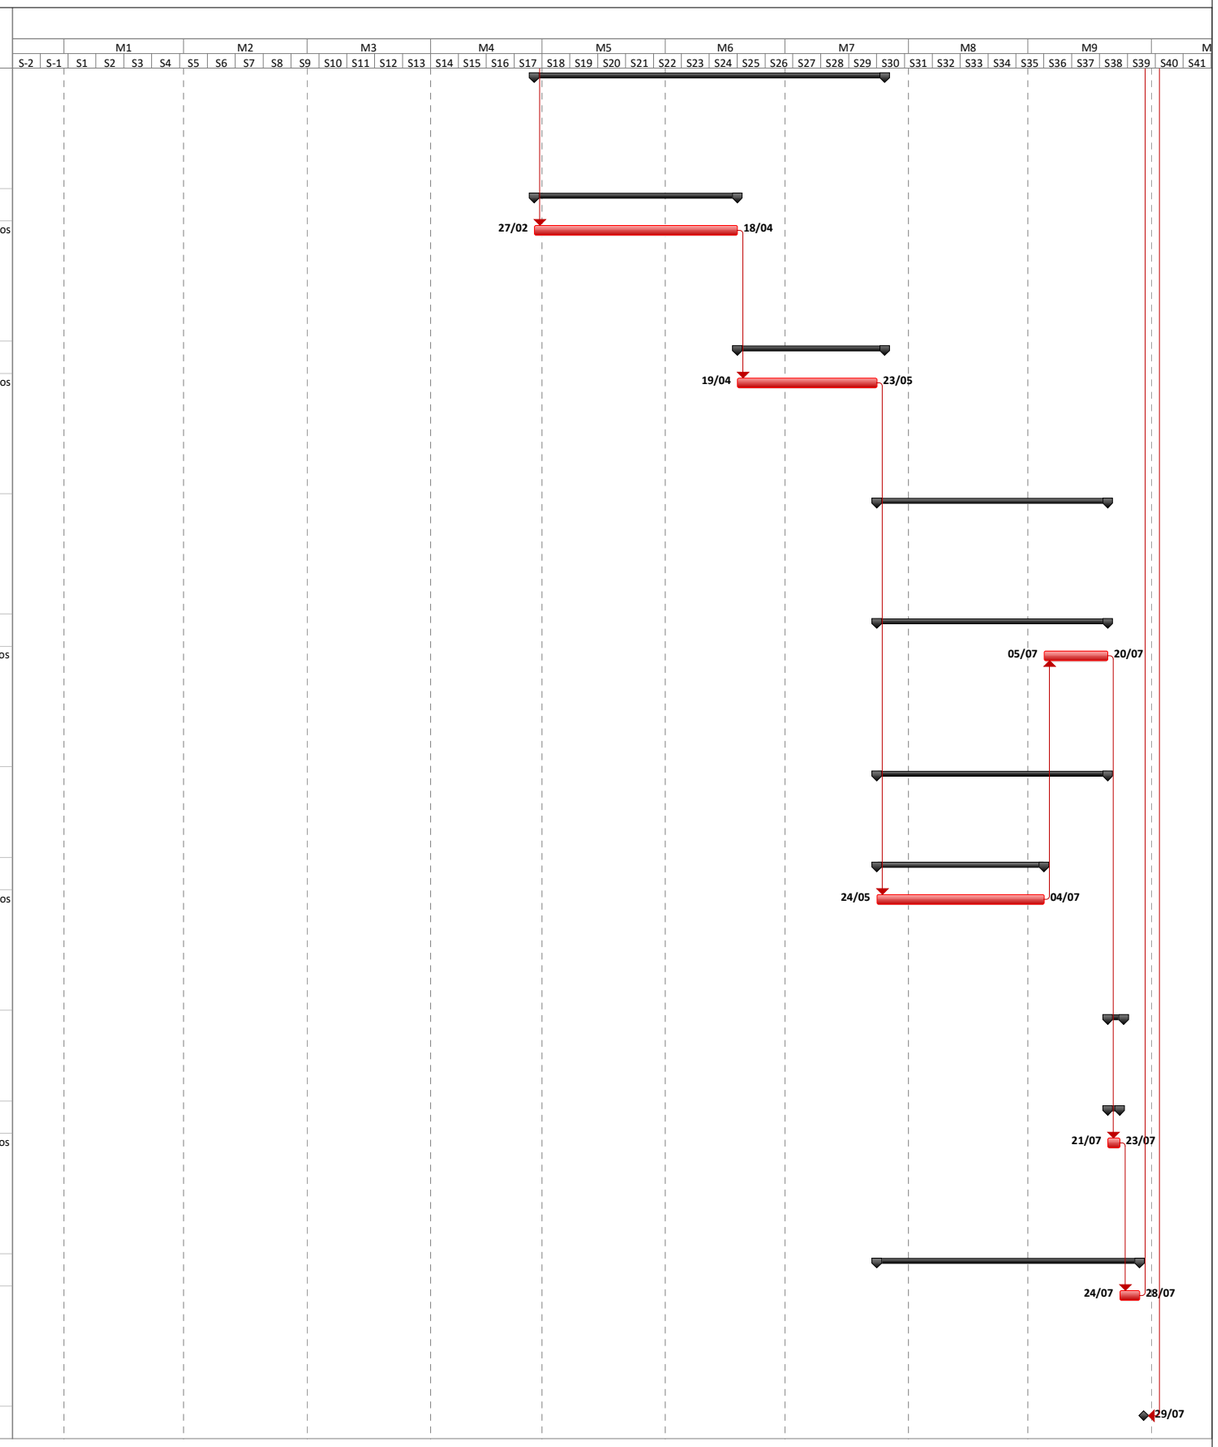

Tarefa | Tarefa Crítica | Marco | Sumário | Dividir
