PLANO DE TRABALHOS

Alargamento do perfil da Rua de Farilhe - Canidelo

Municipio de Vila do Conde

ID	ITEM	ACTIVIDADE	DURAÇÃO TOTAL (Dias	DURAÇÃO (Dias úteis)	INICIO	FIM	PRECEDÊ
1		CONTRATO	1 d	1 d	Qua 24/06/20	Qua 24/06/20	
2		APRESENTAÇÃO DO PSS	1 d	1 d	Qui 16/07/20	Qui 16/07/20	1CI+15 d
3		Consignação / Aprovação PSS	1 d	1 d	Seg 03/08/20	Seg 03/08/20	1CI+27 d
4		**Alargamento do perfil da Rua de Farilhe - Canidelo**	**150 d**	**108 d?**	**Ter 04/08/20**	**Qui 31/12/20**	
5	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS	150 d	108 d	Ter 04/08/20	Qui 31/12/20	3
6	2	ARRANJOS EXTERIORES	126 d	90 d	Ter 11/08/20	Seg 14/12/20	5II+5 d
7	3	ALVENARIAS	119 d	85 d	Ter 25/08/20	Seg 21/12/20	6CI-80 d
8	4	REVESTIMENTO DE PAREDES	38 d	28 d	Ter 24/11/20	Qui 31/12/20	7CI-20 d
9	5	SERRALHARIAS	1 d	1 d?	Qua 30/12/20	Qua 30/12/20	8CI-2 d
10	6	PINTURAS E ACABAMENTOS FIN	1 d	1 d?	Qua 30/12/20	Qua 30/12/20	8CI-2 d
11	7	DIVERSOS	1 d	1 d?	Qui 31/12/20	Qui 31/12/20	10

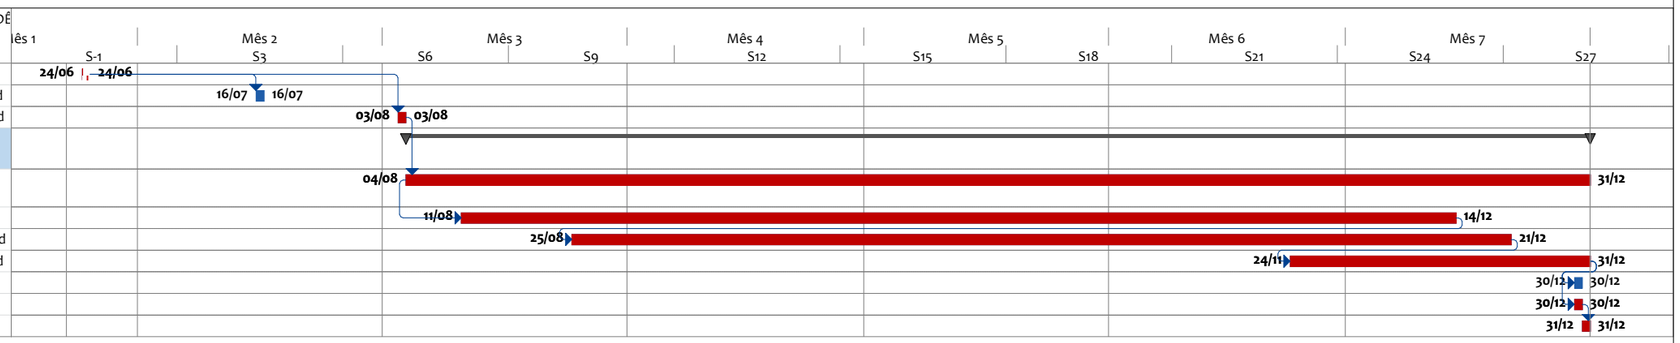

Assinado Por: ADAO JOAQUIM SOARES DA COSTA
Entitlement - ASSINAR DOCUMENTOS E CONTRATOS
Certificate Profile - Qualified Certificate - Representative
"ADAO J.S. COSTA - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, LDA"

Certificado Digital Qualificado - Membro
Documento assinado eletronicamente.
Esta assinatura eletrónica substitui a assinatura autógrafa na UE.

Tarefa	Tarefa Critica	Marco	Tarefa Inactiva	Progresso Manual
Paragem	Paragem Critica	Resumo	Tarefa Descontínua	

Prazo de execução - 150 dias
DURAÇÃO DAS ACTIVIDADES - (8 HORAS/DIA - 5 DIAS/SEMANA)

ESCALA MAIOR: MESES
ESCALA MENOR: SEMANAS
